



# Proyecto Putaendo Hospital Pinel

Generado el 24-09-2026

## Putaendo Hospital Pinel

EN DESARROLLO

TAG HPIN

Cliente Putaendo Hospital Pinel

Categoría Montaje e instalación

Avance 100,0%

Inicio 03-03-2026

Cierre 03-03-2027

64/100

Nota del Proyecto  
Aprobado

53,8%

Margen estimado al cierre  
Objetivo 25% · mediana cartera  
45,6%

27,6%

Desviación estimada al cierre  
Presupuesto \$6.085.600


\$16.801.799

Monto de Venta (sin IVA)  
11,8% de la venta de la cartera

### ALERTAS DE DATOS Y DE PRESUPUESTO


- Avance 100 % pero con fecha de cierre futura (03-03-2027): revisar cuál de los dos está desactualizado.
- Terminado con sobrecosto de +27,6 % sobre el presupuesto.

### PRESUPUESTO VS. GASTO REAL POR CATEGORÍA

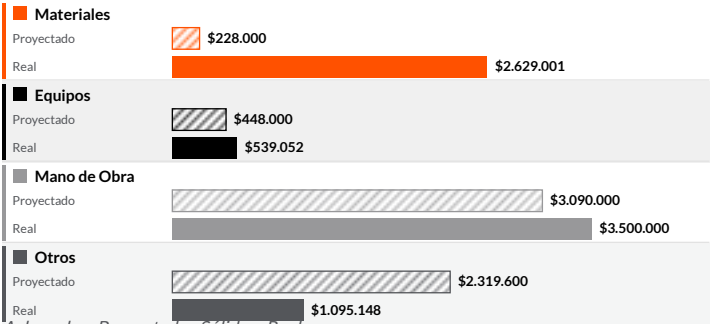

Achurado = Proyectado · Sólido = Real.

### COMPOSICIÓN DEL COSTO REAL

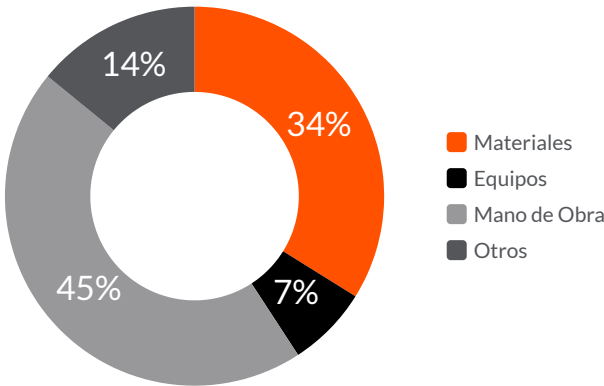

### DATOS CLAVE

| Concepto                  | Monto        |
|---------------------------|--------------|
| Monto de Venta (sin IVA)  | \$16.801.799 |
| Costo presupuestado       | \$6.085.600  |
| Costo real a la fecha     | \$7.763.201  |
| Costo estimado al cierre  | \$7.763.201  |
| Margen estimado al cierre | \$9.038.598  |

### INDICADORES COMPLETOS DEL PLAYBOOK

| RESULTADO A LA FECHA         |              |                          |
|------------------------------|--------------|--------------------------|
| Margen neto %                | 53,8%        | Objetivo playbook: 25%   |
| Desviación % Total           | 27,6%        | Ideal: cercano a 0%      |
| Ahorro/Sobrecosto Total      | \$-1.677.601 | Ideal: positivo (ahorro) |
| Margen por día de ejecución  | —            |                          |
| PRESUPUESTO POR CATEGORÍA    |              |                          |
| Desviación % Materiales      | 1.053,1%     | Ideal: cercano a 0%      |
| Desviación % Equipos         | 20,3%        | Ideal: cercano a 0%      |
| Desviación % MO              | 13,3%        | Ideal: cercano a 0%      |
| Desviación % Otros           | -52,8%       | Ideal: cercano a 0%      |
| Error del presupuesto %      | 67,8%        | Ideal: cercano a 0%      |
| Ahorro/Sobrecosto Materiales | \$-2.401.001 | Ideal: positivo (ahorro) |
| Ahorro/Sobrecosto Equipos    | \$-91.052    | Ideal: positivo (ahorro) |
| Ahorro/Sobrecosto MO         | \$-410.000   | Ideal: positivo (ahorro) |
| Ahorro/Sobrecosto Otros      | \$1.224.452  | Ideal: positivo (ahorro) |

| PROYECCIÓN AL CIERRE                           |             |                           |
|------------------------------------------------|-------------|---------------------------|
| Costo estimado al cierre                       | \$7.763.201 |                           |
| Margen estimado al cierre                      | \$9.038.598 |                           |
| Margen estimado al cierre %                    | 53,8%       | Objetivo playbook: 25%    |
| Desviación estimada al cierre %                | 27,6%       | Sobrecosto sobre +10%     |
| Margen al cierre % (escenario índice de costo) | 53,8%       | Escenario pesimista       |
| Nota del Proyecto                              | 64/100      | Bueno ≥70 · Excelente ≥85 |
| Evaluación                                     | Aprobado    | Clasifica la Nota         |
| ESTRUCTURA DEL COSTO REAL                      |             |                           |
| Costo Materiales % de venta                    | 15,6%       |                           |
| Costo Equipos % de venta                       | 3,2%        |                           |
| Costo MO % de venta                            | 20,8%       |                           |
| Costo Otros % de venta                         | 6,5%        |                           |
| Estructura % Materiales                        | 33,9%       |                           |
| Estructura % Equipos                           | 6,9%        |                           |
| Estructura % MO                                | 45,1%       |                           |
| Estructura % Otros                             | 14,1%       |                           |



## Análisis — Proyecto Putaendo Hospital Pinel (HPIN)

Un margen de 53,8% —8 puntos sobre la mediana de la cartera— construido encima del peor error de cotización registrado: Materiales se presupuestó en \$228.000 y costó \$2.629.001, un desvío de +1.053,1%. El proyecto salvó el resultado por precio de venta, no por control de costos, y su Nota de 64/100 lo penaliza correctamente por un sobrecosto de +27,6%.

### Fortalezas

- Margen al cierre de **\$9.038.598 (53,8%)**: el precio de venta absorbió **\$1.677.601 de sobrecosto sin comprometer la rentabilidad**.
- Otros cerró **-52,8% bajo presupuesto**, aportando \$1.224.452 que compensaron buena parte del desborde de Materiales.
- Es el **11,8% de la venta de la cartera**, el segundo proyecto más grande de la empresa.

### Debilidades / riesgos

- **Materiales costó 11,5 veces lo presupuestado (+1.053,1%)**. Contra un sesgo de cartera de +16,6%, es un error de alcance de este proyecto, no una tendencia de la empresa.
- **Sobrecosto de +27,6%**, casi en el umbral de +30% donde el componente de control de la Nota llega a cero.
- **100% de avance con fecha de cierre futura (03-03-2027)**: uno de los dos datos está desactualizado y el proyecto figura en desarrollo.
- Error del presupuesto de **67,8%**, el segundo peor de la cartera: MO +13,3% y Equipos +20,3% también se pasaron.

### Análisis de KPIs

HPIN separa dos preguntas que suelen confundirse: cuánto ganó el proyecto (margen 53,8%, excelente) y qué tan bien se supo de antemano lo que iba a costar (Error del presupuesto 67,8%, malo). La Nota de 64/100 promedia ambas y queda bajo la mediana de 81,5 pese a un margen superior a ella. Esa es la señal correcta: un proyecto rentable por accidente no es un proceso repetible. El riesgo concreto es que el próximo trabajo se cotee con la misma línea de \$228.000 en materiales y el precio ya no alcance para absorber la diferencia.

### Qué hacer con esto

1. **Reconstruir la partida de materiales con el costo real (\$2.629.001)** antes de cotizar el siguiente hospital.
2. **Corregir la inconsistencia de fechas**: cerrar con la fecha real o bajar el avance al valor efectivo.
3. **Tratar el margen de 53,8% como no repetible** al proyectar la línea Montaje e instalación.
