



Proyecto Putaendo Hospital Pinel

Generado el 24-09-2026

Putaendo Hospital Pinel

EN DESARROLLO

TAG HPIN

Cliente Putaendo Hospital Pinel

Categoría Montaje e instalación

Avance 100,0%

Inicio 03-03-2026

Cierre 03-03-2027

64/100

Nota del Proyecto
Aprobado

53,8%

Margen estimado al cierre
Objetivo 25% · mediana cartera
45,6%

27,6%

Desviación estimada al cierre
Presupuesto \$6.085.600


\$16.801.799

Monto de Venta (sin IVA)
11,8% de la venta de la cartera

ALERTAS DE DATOS Y DE PRESUPUESTO


- Avance 100 % pero con fecha de cierre futura (03-03-2027): revisar cuál de los dos está desactualizado.
- Terminado con sobrecosto de +27,6 % sobre el presupuesto.

PRESUPUESTO VS. GASTO REAL POR CATEGORÍA

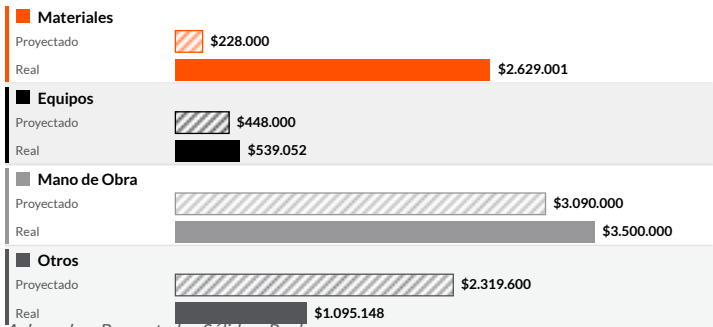

Achurado = Proyectado · Sólido = Real.

COMPOSICIÓN DEL COSTO REAL

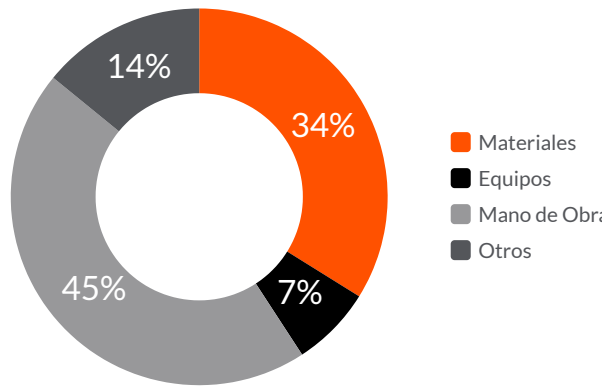

DATOS CLAVE

Concepto	Monto
Monto de Venta (sin IVA)	\$16.801.799
Costo presupuestado	\$6.085.600
Costo real a la fecha	\$7.763.201
Costo estimado al cierre	\$7.763.201
Margen estimado al cierre	\$9.038.598

INDICADORES COMPLETOS DEL PLAYBOOK

RESULTADO A LA FECHA		
Margen neto %	53,8%	Objetivo playbook: 25%
Desviación % Total	27,6%	Ideal: cercano a 0%
Ahorro/Sobrecosto Total	\$-1.677.601	Ideal: positivo (ahorro)
Margen por día de ejecución	—	
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA		
Desviación % Materiales	1.053,1%	Ideal: cercano a 0%
Desviación % Equipos	20,3%	Ideal: cercano a 0%
Desviación % MO	13,3%	Ideal: cercano a 0%
Desviación % Otros	-52,8%	Ideal: cercano a 0%
Error del presupuesto %	67,8%	Ideal: cercano a 0%
Ahorro/Sobrecosto Materiales	\$-2.401.001	Ideal: positivo (ahorro)
Ahorro/Sobrecosto Equipos	\$-91.052	Ideal: positivo (ahorro)
Ahorro/Sobrecosto MO	\$-410.000	Ideal: positivo (ahorro)
Ahorro/Sobrecosto Otros	\$1.224.452	Ideal: positivo (ahorro)

PROYECCIÓN AL CIERRE		
Costo estimado al cierre	\$7.763.201	
Margen estimado al cierre	\$9.038.598	
Margen estimado al cierre %	53,8%	Objetivo playbook: 25%
Desviación estimada al cierre %	27,6%	Sobrecosto sobre +10%
Margen al cierre % (escenario índice de costo)	53,8%	Escenario pesimista
Nota del Proyecto	64/100	Bueno ≥70 · Excelente ≥85
Evaluación	Aprobado	Clasifica la Nota
ESTRUCTURA DEL COSTO REAL		
Costo Materiales % de venta	15,6%	
Costo Equipos % de venta	3,2%	
Costo MO % de venta	20,8%	
Costo Otros % de venta	6,5%	
Estructura % Materiales	33,9%	
Estructura % Equipos	6,9%	
Estructura % MO	45,1%	
Estructura % Otros	14,1%	



Análisis — Proyecto Putaendo Hospital Pinel (HPIN)

Un margen estimado al cierre de 53,8% —8 puntos sobre la mediana de la cartera— construido encima del peor error de cotización registrado: Materiales se presupuestó en \$228.000 y va en \$2.629.001 (+1.053,1%). El resultado lo sostiene el precio de venta, no el control de costos, y la Nota de 64/100 lo refleja. Todas las cifras suponen que el avance de 100% es correcto; la fecha de cierre (03-03-2027) dice otra cosa.

Fortalezas

- Margen estimado al cierre de **\$9.038.598 (53,8%)**: el precio absorbió **\$1.677.601 de sobrecosto** y aun así el margen duplica el objetivo de 25%.
- Otros va **-52,8% bajo presupuesto**: \$1.224.452 de ahorro que compensan buena parte del desborde de Materiales.
- Pesa el **11,8% de la venta de la cartera**: el tercer proyecto más grande, y el segundo entre los 8 con datos completos.

Debilidades / riesgos

- **Materiales costó 11,5 veces lo presupuestado (+1.053,1%)**. Contra un sesgo de cartera de +16,6% en esa categoría, es un error de alcance de este proyecto, no una tendencia de la empresa.
- **Sobrecosto de +27,6%**, a 2,4 puntos del +30% donde el componente de control de la Nota llega a cero.
- **Error del presupuesto de 67,8%**, el segundo peor de la cartera: Equipos (+20,3%) y Mano de Obra (+13,3%) también se pasaron, contra un sesgo de cartera de -11,4% y +1,0%.
- **Avance 100% con cierre al 03-03-2027**: si el avance real es menor, queda gasto por registrar y el sobrecosto crece.

Análisis de KPIs

HPIN separa dos preguntas que suelen confundirse: cuánto gana el proyecto (margen 53,8%, sobre la mediana) y qué tan bien se supo de antemano lo que iba a costar (error del presupuesto 67,8%, malo). La Nota pondera 70% el margen y 30% el control del sobrecosto: el margen aporta 88 de 100 puntos, pero el control ya está en 8 de 100. Por eso queda en 64, bajo la mediana de 81,5 pese a ganar más que ella. Es la señal correcta: un margen que depende del precio y no de la cotización no es repetible, y el próximo trabajo cotizado con la misma línea de \$228.000 en materiales puede no tener precio suficiente para absorber la diferencia.

Qué hacer con esto

1. **Reconstruir la partida de materiales con el costo real** (\$2.629.001) antes de cotizar el próximo hospital.
2. **Corregir la inconsistencia de fechas**: si el proyecto terminó, poner la fecha de cierre real; si no, bajar el avance al valor efectivo.
3. **No usar el 53,8% como referencia** al proyectar la línea Montaje e instalación: lo sostuvo el precio, no la cotización.
