



Proyecto Junji's Valparaíso

Generado el 24-09-2026

Junji's Valparaíso

EN DESARROLLO

TAG JUNJ

Cliente Junji's Valparaíso

Categoría Mantenimiento

Avance 75,0%

Inicio 18-03-2026

Cierre 18-03-2027

54/100

Nota del Proyecto
Requiere atención

24,4%

Margen estimado al cierre
Objetivo 25% · mediana cartera
45,6%

23,9%

Desviación estimada al cierre
Presupuesto \$19.235.600


\$31.508.600

Monto de Venta (sin IVA)
22,1% de la venta de la cartera


ALERTAS DE DATOS Y DE PRESUPUESTO

- Sobrecosto estimado al cierre de +23,9 %: con 75,0 % de avance ya se gastó el 98,9 % del presupuesto.

PRESUPUESTO VS. GASTO REAL POR CATEGORÍA

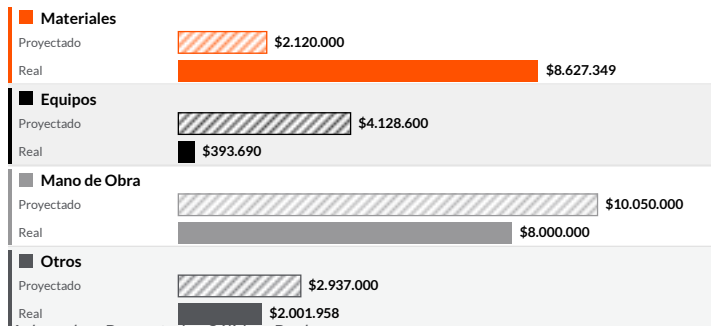

COMPOSICIÓN DEL COSTO REAL

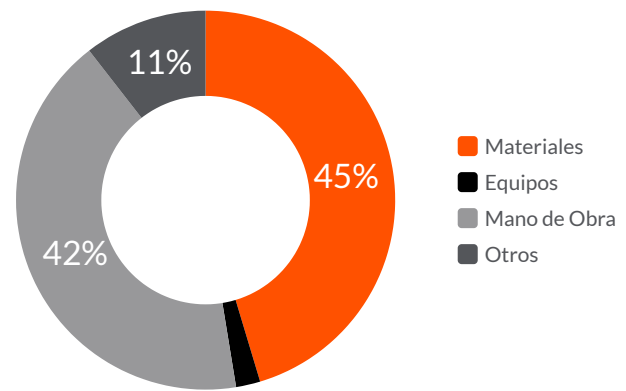

DATOS CLAVE

Concepto	Monto
Monto de Venta (sin IVA)	\$31.508.600
Costo presupuestado	\$19.235.600
Costo real a la fecha	\$19.022.996
Costo estimado al cierre	\$23.831.896
Margen estimado al cierre	\$7.676.704

INDICADORES COMPLETOS DEL PLAYBOOK

RESULTADO A LA FECHA		
Margen neto %	39,6%	Objetivo playbook: 25%
Desviación % Total	-1,1%	Ideal: cercano a 0%
Ahorro/Sobrecosto Total	\$212.604	Ideal: positivo (ahorro)
Margen por día de ejecución	—	
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA		
Desviación % Materiales	307,0%	Ideal: cercano a 0%
Desviación % Equipos	-90,5%	Ideal: cercano a 0%
Desviación % MO	-20,4%	Ideal: cercano a 0%
Desviación % Otros	-31,8%	Ideal: cercano a 0%
Error del presupuesto %	68,8%	Ideal: cercano a 0%
Ahorro/Sobrecosto Materiales	\$-6.507.349	Ideal: positivo (ahorro)
Ahorro/Sobrecosto Equipos	\$3.734.910	Ideal: positivo (ahorro)
Ahorro/Sobrecosto MO	\$2.050.000	Ideal: positivo (ahorro)
Ahorro/Sobrecosto Otros	\$935.042	Ideal: positivo (ahorro)

PROYECCIÓN AL CIERRE		
Costo estimado al cierre	\$23.831.896	
Margen estimado al cierre	\$7.676.704	
Margen estimado al cierre %	24,4%	Objetivo playbook: 25%
Desviación estimada al cierre %	23,9%	Sobrecosto sobre +10%
Margen al cierre % (escenario índice de costo)	19,5%	Escenario pesimista
Nota del Proyecto	54/100	Bueno ≥ 70 · Excelente ≥ 85
Evaluación	Requiere atención	Clasifica la Nota
ESTRUCTURA DEL COSTO REAL		
Costo Materiales % de venta	27,4%	
Costo Equipos % de venta	1,2%	
Costo MO % de venta	25,4%	
Costo Otros % de venta	6,4%	
Estructura % Materiales	45,4%	
Estructura % Equipos	2,1%	
Estructura % MO	42,1%	
Estructura % Otros	10,5%	



Análisis — Proyecto Junji's Valparaiso (JUNJ)

El proyecto más grande de la cartera (22,1% de la venta total) y el de peor Nota: 54/100, Requiere atención. Con 75,0% de avance ya consumió el 98,9% de su presupuesto. El margen a la fecha se ve en 39,6%, pero proyectado al cierre cae a 24,4% —bajo el objetivo de 25%— y en el escenario de índice de costo, a 19,5%. Es el principal riesgo abierto de la empresa.

Fortalezas

- **Venta de \$31.508.600**, más del doble que el siguiente proyecto: **incluso en el escenario pesimista de 19,5% aporta cerca de \$6,1 millones de margen**.
- Mano de Obra cerrará **-20,4% bajo presupuesto** (\$10.050.000 → \$8.000.000 a la fecha), la partida individual más grande del proyecto: **la gestión de horas es lo único que está funcionando**.
- Otros se ejecuta **-31,8% bajo presupuesto**, en línea con el sesgo favorable de la cartera (-21,5%).

Debilidades / riesgos

- **Materiales va en +307,0%: \$8.627.349 contra \$2.120.000 presupuestados**, un exceso de \$6.507.349 que por sí solo consume el 85% del margen estimado al cierre.
- **Alerta activa: con 75% de avance se lleva gastado el 98,9% del presupuesto**. El 25% de obra restante debe ejecutarse prácticamente sin presupuesto disponible.
- Equipos marca **-90,5%** (\$4.128.600 → \$393.690): o queda gasto mayor por venir en el tramo final, o el trabajo se está haciendo con recursos contabilizados en Materiales. **En cualquiera de los dos casos el estimado al cierre de 24,4% es optimista**.
- Error del presupuesto de **68,8%, el peor de la cartera**, sobre el proyecto de mayor exposición económica de la empresa.
- Alerta de fechas: **75% de avance con cierre proyectado al 18-03-2027**, a 18 meses del inicio — un horizonte largo para un sobre costo que ya se materializó.

Análisis de KPIs

Este proyecto es la razón por la que la Nota pasó a calcularse sobre el estimado al cierre y no sobre el gasto a la fecha. Leído a la fecha, JUNJ muestra 39,6% de margen y parecería un proyecto sano; leído al cierre, 24,4%, bajo el objetivo, con una desviación de +23,9% que deja el componente de control en apenas 6 de 30 puntos posibles. Los tres escenarios disponibles —39,6% a la fecha, 24,4% al cierre, 19,5% por índice de costo— abren un rango de \$6,1 a \$12,5 millones de margen sobre un mismo proyecto. Esa dispersión, sobre el 22,1% de la venta de la empresa, es el número que más conviene cerrar.

Qué hacer con esto

1. **Revalidar el 25% de avance pendiente con un presupuesto actualizado**: saber si los \$393.690 de Equipos están por crecer decide si el cierre real se parece al 24,4% o al 19,5%.
2. **Verificar si parte de los \$8,6 millones de Materiales corresponde a Equipos mal clasificados**: el patrón +307% en Materiales junto a -90,5% en Equipos sugiere migración entre partidas, no solo sobre costo.
3. **Evaluar si hay alcance adicional facturable** — con el presupuesto agotado al 98,9% y un cuarto de obra por delante, cualquier extensión no cobrada sale directo del margen.
4. **Someter este proyecto a seguimiento mensual hasta el cierre**: es el único de la cartera cuyo resultado puede mover el margen consolidado de la empresa en varios puntos.
