



Proyecto CREM – Cremación Concepción

Generado el 20-08-2026

Proyecto CREM – Cremación Concepción – Panel de verificación

66/100

Nota del Proyecto

19,3%

Margen neto %

4,9%

Desviación % Total


Aprobado

Evaluación


DATOS CLAVE

Concepto	Monto
Monto de Venta (sin IVA)	\$6.518.650
Total Real	\$5.263.162
Margen Real	\$1.255.488

COMPOSICIÓN DE COSTOS REALES

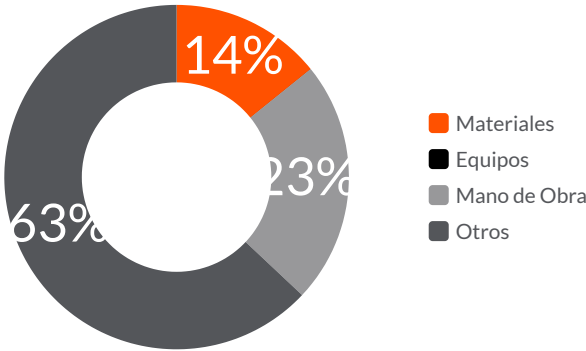

COSTOS PROYECTADOS VS. REALES POR CATEGORÍA DE GASTO

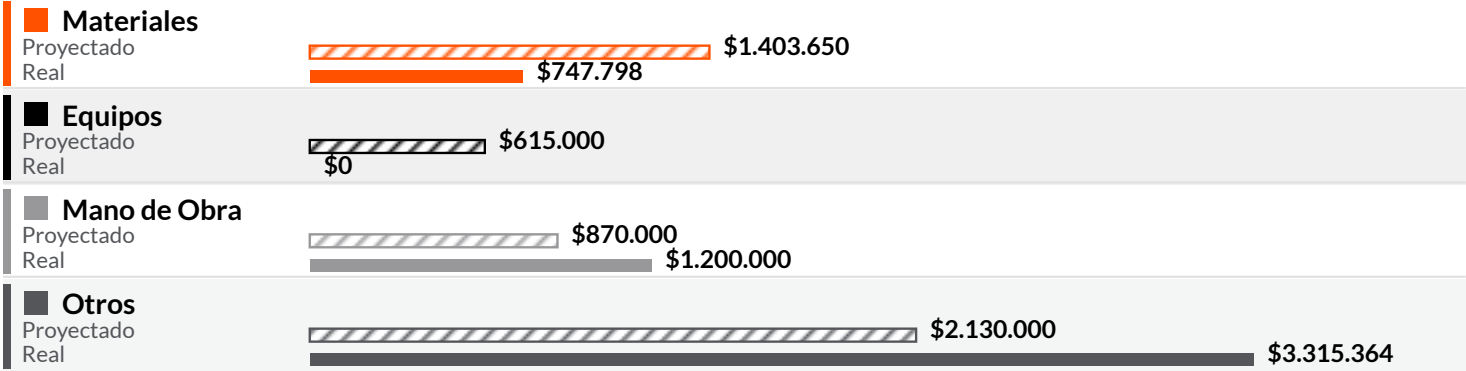

INDICADORES COMPLETOS – PROYECTO CREM – NARANJO/NEGRITA = KPI FUERA DE RANGO

KPI	Valor	Referencia
Margen neto %	19,3%	Objetivo playbook: 25%
Costo Materiales % de venta	11,5%	
Costo Equipos % de venta	0,0%	
Costo MO % de venta	18,4%	
Costo Otros % de venta	50,9%	
Estructura % Materiales	14,2%	
Estructura % Equipos	0,0%	
Estructura % MO	22,8%	
Estructura % Otros	63,0%	
Desviación % Materiales	-46,7%	Ideal: cercano a 0%
Desviación % Equipos	-100,0%	Ideal: cercano a 0%
Desviación % MO	37,9%	Ideal: cercano a 0%
Desviación % Otros	55,7%	Ideal: cercano a 0%
Desviación % Total	4,9%	Ideal: cercano a 0%
Ahorro/Sobrecosto Materiales	\$655.852	Ideal: positivo (ahorro)
Ahorro/Sobrecosto Equipos	\$615.000	Ideal: positivo (ahorro)
Ahorro/Sobrecosto MO	\$-330.000	Ideal: positivo (ahorro)
Ahorro/Sobrecosto Otros	\$-1.185.364	Ideal: positivo (ahorro)
Ahorro/Sobrecosto Total	\$-244.512	Ideal: positivo (ahorro)
Nota del Proyecto	66/100	



Análisis — Proyecto CREM

El proyecto CREM (Cremación Concepción, cliente Cremación Concepción) cerró con un margen neto de **19,3%, por debajo** del objetivo del playbook (25%) — el único de los 5 proyectos evaluados en esta ronda de reportes que no lo alcanza. El resultado está dominado por un fuerte sobrecosto en "Otros" (55,7% sobre lo proyectado, \$1.185.364 de sobrecosto), que el ahorro en Materiales y Equipos no alcanza a compensar. Nota del Proyecto: **66/100 ("Aprobado")** — aprobado, pero el más bajo de los 5.

Fortalezas

- Ahorro en Materiales de **\$655.852** (desviación -46,7%) y ahorro total en Equipos de **\$615.000** (sin gasto real pese a \$615.000 presupuestados).
- Nota del Proyecto 66/100 ("Aprobado") — pasa el umbral aprobatorio del playbook (≥ 55) pese al sobrecosto marcado en "Otros".

Debilidades / riesgos

- Sobrecosto marcado en "Otros": **\$3.315.364** real vs. **\$2.130.000** proyectado (desviación 55,7%, \$1.185.364 sobre lo proyectado) — es, por lejos, el principal factor que empuja el margen del proyecto por debajo del objetivo del playbook.
- Sobrecosto también en Mano de Obra (desviación 37,9%, \$330.000 sobre lo proyectado).
- Nota de trazabilidad:** el costo real "Otros" de este proyecto cambió de forma significativa (de un valor bajo a los \$3.315.364 actuales) durante la elaboración de esta misma ronda de reportes — si se compara este reporte contra una versión anterior, la diferencia refleja una actualización real de los datos fuente en Centro de Costos, no un error de cálculo de este reporte.

Análisis de KPIs

"Estructura % Otros" (63,0% de los costos reales) es, con diferencia, el KPI más atípico de este proyecto — más de la mitad del costo real total quedó concentrado en una sola categoría de gasto, cuando lo proyectado la ponía en un rol relevante pero no dominante. Antes de tomar cualquier decisión comercial basada en el margen actual, revisar el desglose de "Detalle Costos Reales" de este proyecto en el Excel para identificar qué ítems concretos componen ese sobrecosto — sin ese detalle, no es posible distinguir entre un problema de ejecución, un cambio de alcance, o un error de registro en Centro de Costos.

Notas de cierre

- Priorizar la revisión del detalle de "Otros Costos Reales" de CREM en Centro de Costos — el sobrecosto de \$1.185.364 en esa categoría es el hallazgo más relevante de este reporte.
- No usar el margen actual de este proyecto (19,3%) como referencia de cotización para proyectos similares de Mantenimiento sin antes confirmar si el sobrecosto en "Otros" es estructural o puntual.
