



Reporte de Categoría – Montaje

Generado el 20-08-2026

Categoría Montaje – Panel de verificación

39,6%

Margen neto % (agregado)

\$6.020.169

Venta total (sin IVA)

1

Nº de proyectos


\$643.894

Ahorro/Sobrecosto Total


DATOS CLAVE

Concepto	Monto
Venta total (sin IVA)	\$6.020.169
Costos Totales Real	\$3.635.313
Margen Real	\$2.384.856
Desviación % Total	-15,0%

COMPOSICIÓN DE COSTOS REALES

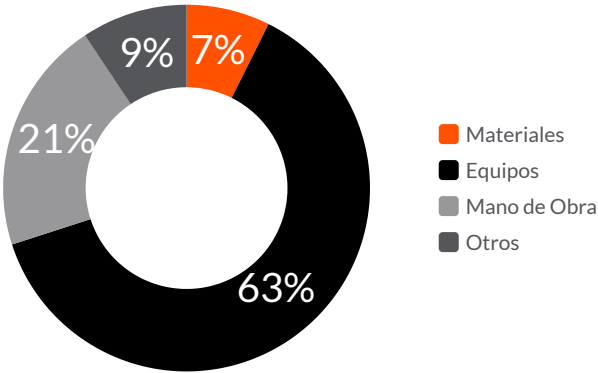

COSTOS PROYECTADOS VS. REALES POR CATEGORÍA DE GASTO

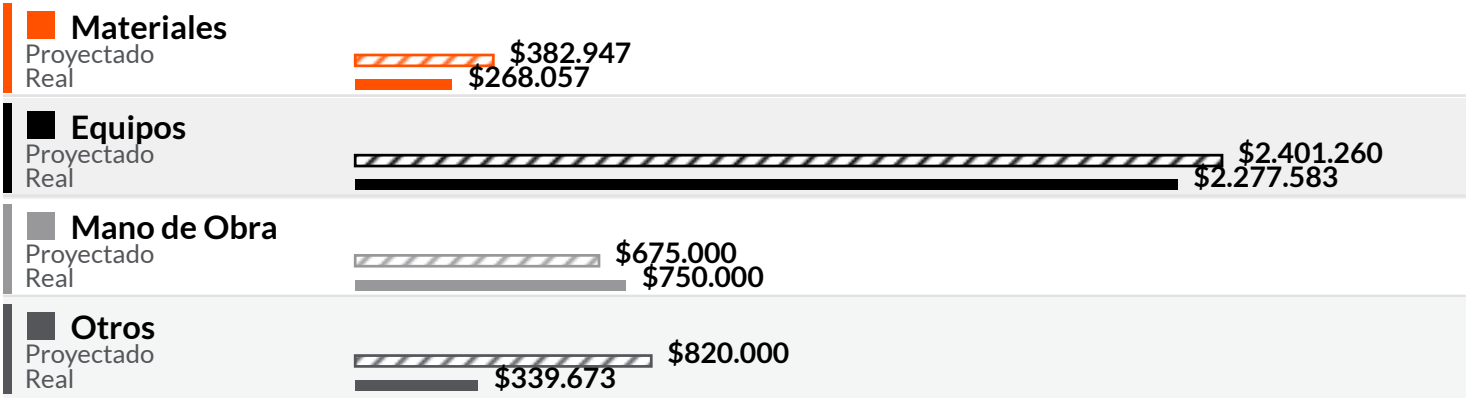

INDICADORES COMPLETOS (1 PROYECTO: CVAL) – NARANJO/NEGRITA = KPI FUERA DE RANGO

KPI	Valor	Referencia
Margen neto %	39,6%	Objetivo playbook: 25%
Costo Materiales % de venta	4,5%	
Costo Equipos % de venta	37,8%	
Costo MO % de venta	12,5%	
Costo Otros % de venta	5,6%	
Estructura % Materiales	7,4%	
Estructura % Equipos	62,7%	
Estructura % MO	20,6%	
Estructura % Otros	9,3%	
Desviación % Materiales	-30,0%	Ideal: cercano a 0%
Desviación % Equipos	-5,2%	Ideal: cercano a 0%
Desviación % MO	11,1%	Ideal: cercano a 0%
Desviación % Otros	-58,6%	Ideal: cercano a 0%
Desviación % Total	-15,0%	Ideal: cercano a 0%
Ahorro/Sobrecosto Materiales	\$114.890	Ideal: positivo (ahorro)
Ahorro/Sobrecosto Equipos	\$123.677	Ideal: positivo (ahorro)
Ahorro/Sobrecosto MO	-\$75.000	Ideal: positivo (ahorro)
Ahorro/Sobrecosto Otros	\$480.327	Ideal: positivo (ahorro)
Ahorro/Sobrecosto Total	\$643.894	Ideal: positivo (ahorro)



Análisis — Categoría Montaje

La categoría **Montaje** agrupa hoy **1 proyecto con datos completos** (CVAL — Caldera Valdivia), con una venta de **\$6.020.169** y un margen neto de **39,6%**, muy por sobre el objetivo del playbook (25%). Los costos reales quedaron **por debajo** de lo proyectado en casi todas las categorías de gasto (desviación total -15,0%), generando un ahorro neto de \$643.894.

Fortalezas

- Margen neto de **39,6%** (\$2.384.856 sobre \$6.020.169 de venta) — muy por sobre el objetivo del playbook (25%), y el único dato disponible de esta categoría hasta ahora.
- Ahorro consistente en 3 de las 4 categorías de gasto: Materiales (\$114.890, desviación -30,0%), Equipos (\$123.677) y Otros (\$480.327, desviación -58,6%).
- Nota del Proyecto de CVAL: **87/100 (Excelente)** — recalculada según el playbook vigente (curva de Nota 2026-08-20), no un valor leído directo de una celda.

Debilidades / riesgos

- Sobrecosto marcado en **Mano de Obra** (desviación 11,1%, \$75.000 sobre lo proyectado) — la única categoría de gasto con sobrecosto en este proyecto.
- **Muestra de un solo proyecto:** todo indicador "agregado" de esta categoría es hoy literalmente el valor individual de CVAL, no un promedio estadísticamente significativo — no usar este reporte como referencia de "cómo se comporta Montaje en general" hasta que se sume un segundo proyecto cerrado con esta Categoría.
- La categoría se creó recién durante esta misma sesión de trabajo, por un cambio manual de Categoría de CVAL (de "Mantenimiento" a "Montaje") hecho por el usuario mientras se generaban otros reportes — confirmar con el usuario que la reclasificación es definitiva antes de tomar decisiones de negocio sobre ella.

Análisis de KPIs

El margen neto (39,6%) queda marcado en naranja en la tabla por superar 1,5× el objetivo del playbook (25%) — no es un error de cálculo, es el criterio centralizado de "KPI fuera de lo esperado" aplicado también a márgenes inusualmente altos, no solo bajos o negativos. Las desviaciones de Materiales (-30,0%) y Otros (-58,6%) también se marcan por superar el umbral de $\pm 30\%$, aunque en sentido favorable (costo real muy por debajo de lo cotizado) — vale la pena revisar si la cotización original de Montaje quedó sobreestimada o si CVAL fue un caso particularmente eficiente antes de usarla como base para futuras cotizaciones de esta categoría.

Notas estratégicas

1. No usar este reporte como benchmark de "Montaje" para nuevas cotizaciones sin confirmar que la muestra sigue en $n=1$ — regenerar en cuanto un segundo proyecto con esta Categoría tenga datos completos.
2. Revisar con el responsable de terreno el sobrecosto en Mano de Obra (+ 11,1%) para saber si es un patrón esperable en trabajos de montaje o un caso puntual de CVAL.
3. Confirmar con el usuario si la reclasificación de Categoría de CVAL (de Mantenimiento a Montaje) es definitiva; si se revierte o cambia de nuevo, este reporte y el de Mantenimiento vuelven a quedar desactualizados.
