



Categoría Montaje e instalación

Generado el 24-09-2026

Montaje e instalación

Proyectos completos 1 Clientes Putaendo Hospital Pinel

\$16.801.799

Venta de la categoría
11,8% de la venta de la cartera

\$9.038.598

Margen acumulado (al cierre)


53,8%

Margen % ponderado
Objetivo 25%


91/100

Nota promedio
1 proyecto(s) · 1 cliente(s)

PRESUPUESTO VS. GASTO REAL POR CATEGORÍA

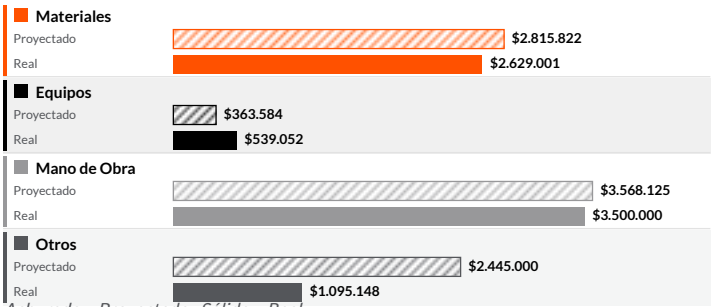

COMPOSICIÓN DEL COSTO REAL

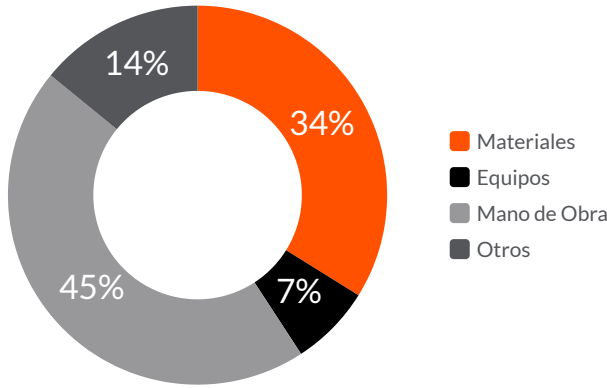

PROYECTOS CONSIDERADOS (SOLO LOS DE DATOS COMPLETOS)

TAG	Proyecto	Avance	Venta	Margen al cierre	Margen %	Nota
HPIN	Putaendo Hospital Pinel	100,0%	\$16.801.799	\$9.038.598	53,8%	91/100

INDICADORES COMPLETOS DEL PLAYBOOK (PONDERADOS POR VENTA)

RESULTADO A LA FECHA		
Margen neto %	53,8%	Objetivo playbook: 25%
Desviación % Total	-15,5%	Ideal: cercano a 0%
Ahorro/Sobrecosto Total	\$1.429.330	Ideal: positivo (ahorro)
Margen por día de ejecución	—	
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA		
Desviación % Materiales	-6,6%	Ideal: cercano a 0%
Desviación % Equipos	48,3%	Ideal: cercano a 0%
Desviación % MO	-1,9%	Ideal: cercano a 0%
Desviación % Otros	-55,2%	Ideal: cercano a 0%
Error del presupuesto %	19,4%	Ideal: cercano a 0%
Ahorro/Sobrecosto Materiales	\$186.821	Ideal: positivo (ahorro)
Ahorro/Sobrecosto Equipos	\$-175.468	Ideal: positivo (ahorro)
Ahorro/Sobrecosto MO	\$68.125	Ideal: positivo (ahorro)
Ahorro/Sobrecosto Otros	\$1.349.852	Ideal: positivo (ahorro)

PROYECCIÓN AL CIERRE		
Costo estimado al cierre	\$7.763.201	
Margen estimado al cierre	\$9.038.598	
Margen estimado al cierre %	53,8%	Objetivo playbook: 25%
Desviación estimada al cierre %	-15,5%	Sobrecosto sobre +10%
Margen al cierre % (escenario índice de costo)	—	Escenario pesimista
Nota del Proyecto	—	Bueno ≥70 · Excelente ≥85
Evaluación	—	Clasifica la Nota
ESTRUCTURA DEL COSTO REAL		
Costo Materiales % de venta	15,6%	
Costo Equipos % de venta	3,2%	
Costo MO % de venta	20,8%	
Costo Otros % de venta	6,5%	
Estructura % Materiales	33,9%	
Estructura % Equipos	6,9%	
Estructura % MO	45,1%	
Estructura % Otros	14,1%	



Análisis — Categoría Montaje e instalación

Montaje e instalación tiene un solo proyecto con datos completos, HPIN, así que su resultado es el de ese proyecto: \$16.801.799 de venta (11,8% de la cartera), 53,8% de margen y Nota 91/100. Es la segunda categoría más rentable, detrás de I+D+i (58,8%) y muy por sobre Mantenimiento (29,8%), pero con un solo proyecto todavía no es una tendencia.

Fortalezas

- **Segunda categoría por margen:** 53,8%, contra 58,8% de I+D+i, 39,6% de Montaje y 29,8% de Mantenimiento.
- **Presupuesto confiable:** costo final 15,5% bajo lo cotizado, con Materiales a -6,6% y Mano de Obra a -1,9%.

Debilidades / riesgos

- **Muestra de un solo proyecto:** cualquier conclusión sobre la categoría es, en realidad, una conclusión sobre HPIN.
- **Posible duplicado con "Montaje":** Caldera Valdivia (CVAL) está en una categoría aparte llamada Montaje. Si son la misma línea, juntas suman \$22.821.968 de venta con 50,1% de margen, y separadas cada una subrepresenta a la otra.
- **Equipos +48,3%** en su único proyecto: si se repite en el próximo montaje, es un sesgo de la categoría y no un accidente.

Análisis de KPIs

Entre los proyectos con datos completos, Mantenimiento concentra 4 proyectos y \$48.558.633 de venta con 29,8% de margen: es donde la empresa factura más y gana menos por peso vendido. Montaje e instalación, con 53,8% sobre un solo proyecto, sugiere que el trabajo de instalación deja casi el doble de margen por peso que el mantenimiento. Esa diferencia hay que confirmarla con más proyectos antes de reorientar la cartera, pero es la señal más clara que da hoy la división por categorías.

Qué hacer con esto

1. Definir si Montaje y Montaje e instalación son la misma categoría y unificarlas en el Excel si corresponde.
2. Seguir el margen de los próximos montajes contra Mantenimiento: si la brecha se sostiene, es un argumento para priorizar esa línea.
3. Revisar la partida de Equipos en el próximo montaje, para confirmar o descartar el sobre costo de HPIN como patrón.
