



Proyecto Putaendo Hospital Pinel

Generado el 24-09-2026

Putaendo Hospital Pinel

EN DESARROLLO

TAG HPIN

Cliente Putaendo Hospital Pinel

Categoría Montaje e instalación

Avance 100,0%

Inicio 03-03-2026

Cierre 03-03-2027

91/100

Nota del Proyecto
Excelente

53,8%

Margen estimado al cierre
Objetivo 25% · mediana cartera
45,6%

-15,5%

Desviación estimada al cierre
Presupuesto \$9.192.531


\$16.801.799

Monto de Venta (sin IVA)
11,8% de la venta de la cartera


ALERTAS DE DATOS Y DE PRESUPUESTO

- Avance 100 % pero con fecha de cierre futura (03-03-2027): revisar cuál de los dos está desactualizado.

PRESUPUESTO VS. GASTO REAL POR CATEGORÍA

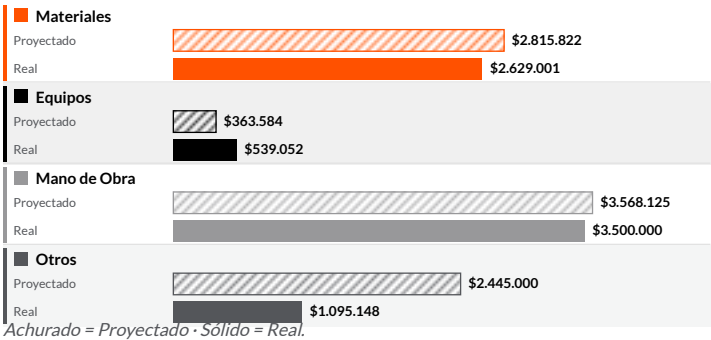

COMPOSICIÓN DEL COSTO REAL

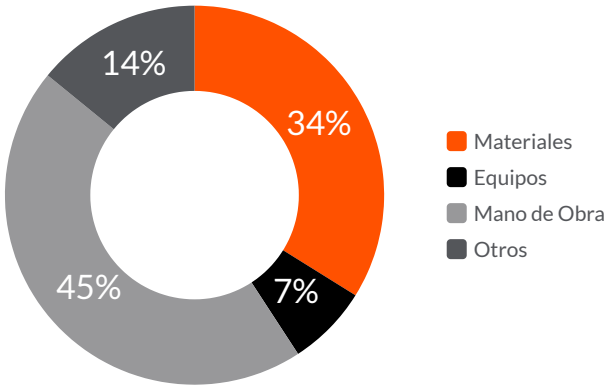

DATOS CLAVE

Concepto	Monto
Monto de Venta (sin IVA)	\$16.801.799
Costo presupuestado	\$9.192.531
Costo real a la fecha	\$7.763.201
Costo estimado al cierre	\$7.763.201
Margen estimado al cierre	\$9.038.598

INDICADORES COMPLETOS DEL PLAYBOOK

RESULTADO A LA FECHA		
Margen neto %	53,8%	Objetivo playbook: 25%
Desviación % Total	-15,5%	Ideal: cercano a 0%
Ahorro/Sobrecosto Total	\$1.429.330	Ideal: positivo (ahorro)
Margen por día de ejecución	—	
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA		
Desviación % Materiales	-6,6%	Ideal: cercano a 0%
Desviación % Equipos	48,3%	Ideal: cercano a 0%
Desviación % MO	-1,9%	Ideal: cercano a 0%
Desviación % Otros	-55,2%	Ideal: cercano a 0%
Error del presupuesto %	19,4%	Ideal: cercano a 0%
Ahorro/Sobrecosto Materiales	\$186.821	Ideal: positivo (ahorro)
Ahorro/Sobrecosto Equipos	\$-175.468	Ideal: positivo (ahorro)
Ahorro/Sobrecosto MO	\$68.125	Ideal: positivo (ahorro)
Ahorro/Sobrecosto Otros	\$1.349.852	Ideal: positivo (ahorro)

PROYECCIÓN AL CIERRE		
Costo estimado al cierre	\$7.763.201	
Margen estimado al cierre	\$9.038.598	
Margen estimado al cierre %	53,8%	Objetivo playbook: 25%
Desviación estimada al cierre %	-15,5%	Sobrecosto sobre +10%
Margen al cierre % (escenario índice de costo)	53,8%	Escenario pesimista
Nota del Proyecto	91/100	Bueno ≥ 70 · Excelente ≥ 85
Evaluación	Excelente	Clasifica la Nota
ESTRUCTURA DEL COSTO REAL		
Costo Materiales % de venta	15,6%	
Costo Equipos % de venta	3,2%	
Costo MO % de venta	20,8%	
Costo Otros % de venta	6,5%	
Estructura % Materiales	33,9%	
Estructura % Equipos	6,9%	
Estructura % MO	45,1%	
Estructura % Otros	14,1%	



Análisis — Proyecto Putaendo Hospital Pinel (HPIN)

Con el presupuesto corregido, HPIN es un proyecto excelente: Nota 91/100 (tercera de la cartera, mediana 84,5) y el mayor margen en pesos de los 8 proyectos con datos completos, \$9.038.598. Gastó \$1.429.330 menos de lo presupuestado (-15,5%) y su error del presupuesto, 19,4%, es el segundo más bajo de la cartera. Todo esto supone que el avance de 100% es correcto: la fecha de cierre (03-03-2027) todavía dice que sigue en curso.

Fortalezas

- **Mayor margen en pesos de la cartera completa:** \$9.038.598 (53,8%), sobre UMAG (\$8.943.265) y más del doble del objetivo de 25%.
- **Presupuesto bien calibrado:** error de 19,4%, el segundo mejor de 8 (cinco de los ocho están entre 55% y 69%). Materiales cerró a -6,6% y Mano de Obra a -1,9%.
- **Pesa el 11,8% de la venta de la cartera:** el tercer proyecto más grande, y el segundo entre los 8 con datos completos.

Debilidades / riesgos

- **Equipos se pasó +48,3%** (\$175.468 sobre lo presupuestado), en una categoría donde la cartera suele gastar menos de lo cotizado (sesgo -9,8%): es la única con sobrecosto y un error propio de este proyecto.
- **El ahorro se concentra en Otros:** de los \$1.429.330 ahorrados, \$1.349.852 (94%) vienen de Otros a -55,2%, más del doble del sesgo de la cartera en esa categoría (-22,5%).
- **Avance 100% con cierre al 03-03-2027:** si el avance real es menor, queda gasto por registrar y el margen baja.

Análisis de KPIs

La Nota de 91 combina un margen muy por sobre el objetivo (53,8% contra 25%, y 8 puntos sobre la mediana de 45,6%) con un costo final bajo el presupuesto, así que el componente de control del sobrecosto suma los 30 puntos completos. Lo que la Nota no muestra es de dónde sale el ahorro: casi todo está en Otros, la categoría que la empresa entera presupuesta de más (-22,5%). La lectura correcta es que HPIN cotizó con precisión Materiales y Mano de Obra —las dos partidas más grandes—, no que haya ahorrado en la ejecución.

Qué hacer con esto

1. **Usar las partidas de Materiales y Mano de Obra de HPIN como referencia** para el próximo proyecto hospitalario: cerraron a -6,6% y -1,9% de lo cotizado.
2. **Revisar la línea de Equipos** antes de cotizar un montaje similar: fue la única que se pasó.
3. **Corregir la inconsistencia de fechas:** si el proyecto terminó, poner la fecha de cierre real; si no, bajar el avance al valor efectivo.
