



Categoría Montaje e instalación

Generado el 24-09-2026

Montaje e instalación

Proyectos completos 1 Clientes Putaendo Hospital Pinel

\$16.801.799

Venta de la categoría
11,8% de la venta de la cartera

\$9.038.598

Margen acumulado (al cierre)


53,8%

Margen % ponderado
Objetivo 25%


64/100

Nota promedio
1 proyecto(s) · 1 cliente(s)

PRESUPUESTO VS. GASTO REAL POR CATEGORÍA

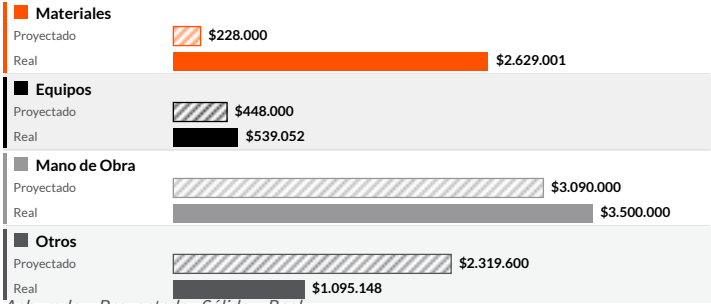

COMPOSICIÓN DEL COSTO REAL

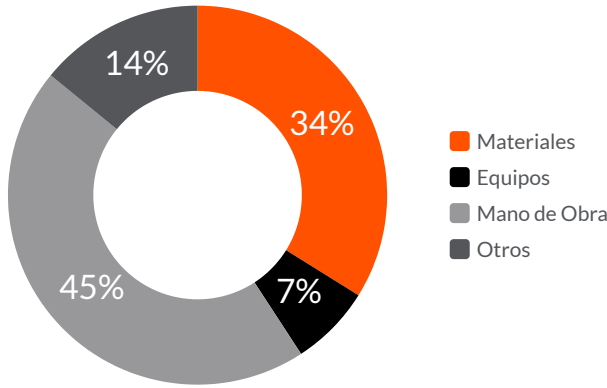

PROYECTOS CONSIDERADOS (SOLO LOS DE DATOS COMPLETOS)

TAG	Proyecto	Avance	Venta	Margen al cierre	Margen %	Nota
HPIN	Putaendo Hospital Pinel	100,0%	\$16.801.799	\$9.038.598	53,8%	64/100

INDICADORES COMPLETOS DEL PLAYBOOK (PONDERADOS POR VENTA)

RESULTADO A LA FECHA		
Margen neto %	53,8%	Objetivo playbook: 25%
Desviación % Total	27,6%	Ideal: cercano a 0%
Ahorro/Sobrecosto Total	\$-1.677.601	Ideal: positivo (ahorro)
Margen por día de ejecución	—	
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA		
Desviación % Materiales	1.053,1%	Ideal: cercano a 0%
Desviación % Equipos	20,3%	Ideal: cercano a 0%
Desviación % MO	13,3%	Ideal: cercano a 0%
Desviación % Otros	-52,8%	Ideal: cercano a 0%
Error del presupuesto %	67,8%	Ideal: cercano a 0%
Ahorro/Sobrecosto Materiales	\$-2.401.001	Ideal: positivo (ahorro)
Ahorro/Sobrecosto Equipos	\$-91.052	Ideal: positivo (ahorro)
Ahorro/Sobrecosto MO	\$-410.000	Ideal: positivo (ahorro)
Ahorro/Sobrecosto Otros	\$1.224.452	Ideal: positivo (ahorro)

PROYECCIÓN AL CIERRE		
Costo estimado al cierre	\$7.763.201	
Margen estimado al cierre	\$9.038.598	
Margen estimado al cierre %	53,8%	Objetivo playbook: 25%
Desviación estimada al cierre %	27,6%	Sobrecosto sobre +10%
Margen al cierre % (escenario índice de costo)	—	Escenario pesimista
Nota del Proyecto	—	Bueno ≥70 · Excelente ≥85
Evaluación	—	Clasifica la Nota
ESTRUCTURA DEL COSTO REAL		
Costo Materiales % de venta	15,6%	
Costo Equipos % de venta	3,2%	
Costo MO % de venta	20,8%	
Costo Otros % de venta	6,5%	
Estructura % Materiales	33,9%	
Estructura % Equipos	6,9%	
Estructura % MO	45,1%	
Estructura % Otros	14,1%	



Análisis — Categoría Montaje e instalación

Categoría de un solo proyecto —Putando Hospital Pinel— con \$16.801.799 de venta (11,8% de la cartera) y 53,8% de margen ponderado, 8 puntos sobre la mediana de la empresa. Es la segunda categoría más rentable, pero ese resultado convive con el peor error de cotización registrado en QUEMPIN: Materiales costó 11,5 veces lo presupuestado.

Fortalezas

- Margen acumulado de **\$9.038.598 (53,8% ponderado)**, el segundo mayor de la cartera en monto absoluto y muy sobre el objetivo de 25%.
- El **precio de venta absorbió \$1.677.601 de sobrecosto sin perder rentabilidad**: la oferta tenía holgura suficiente para resistir un error grave de alcance.
- Otros cerró **-52,8% bajo presupuesto** (\$2.319.600 → \$1.095.148), aportando \$1.224.452 de compensación.
- Con el **11,8% de la venta**, es la segunda categoría por tamaño y **aporta el 15,1% del margen acumulado de la empresa**.

Debilidades / riesgos

- **Materiales en +1.053,1%: \$2.629.001 contra \$228.000 presupuestados**. Es el peor error de estimación de toda la cartera, 1.036 puntos sobre el sesgo general de la empresa.
- Error del presupuesto de **67,8%** y sobrecosto de **+27,6%**, al borde del umbral de +30% donde el control de costos anula su aporte a la Nota: **Nota 64/100, bajo la mediana de 81,5**.
- Equipos **+20,3%** y Mano de Obra **+13,3%**: **ninguna de las cuatro categorías de gasto se estimó correctamente**.
- **Un solo proyecto, un solo cliente, no recurrente**, con alerta de fechas inconsistentes (100% de avance y cierre al 03-03-2027).
- **Coexiste con la categoría "Montaje"**, de nombre casi idéntico y también de un solo proyecto: la taxonomía fragmenta el análisis sin aportar una distinción operativa clara.

Análisis de KPIs

El margen de 53,8% y la Nota de 64/100 apuntan en direcciones opuestas y ambas son correctas. La categoría fue muy rentable porque el precio de venta estaba bien fijado, no porque los costos se hubieran controlado: el Error del presupuesto de 67,8% es el segundo peor de la empresa. Esa distinción define el riesgo real. Si el próximo trabajo de la línea se cotiza con la misma base de materiales —\$228.000 para algo que cuesta \$2,6 millones— y el mercado no permite la misma holgura de precio, el resultado no se parecerá al de hoy. Con $n=1$ no hay forma de saber cuál de las dos cifras describe mejor la línea de negocio.

Qué hacer con esto

1. **Reconstruir el estándar de materiales de la categoría con el costo real** antes de cotizar otro trabajo de instalación hospitalaria — es la corrección más urgente de la cartera.
2. **Tratar el 53,8% como no estructural** al proyectar la línea: con el costo correcto y un precio de mercado normal, la rentabilidad esperable es sustancialmente menor.
3. **Resolver la duplicidad con la categoría "Montaje"**: fusionarlas o documentar qué las separa, para que el análisis por categoría deje de apoyarse en un proyecto cada una.
4. **Regularizar las fechas del proyecto** para que la categoría deje de figurar en desarrollo y sus indicadores de plazo sean utilizables.
