



Categoría Montaje

Generado el 24-09-2026

Montaje

Proyectos completos 1 Clientes Caldera Valdivia

\$6.020.169

Venta de la categoría
4,2% de la venta de la cartera

\$2.384.856

Margen acumulado (al cierre)


39,6%

Margen % ponderado
Objetivo 25%


87/100

Nota promedio
1 proyecto(s) · 1 cliente(s)

PRESUPUESTO VS. GASTO REAL POR CATEGORÍA

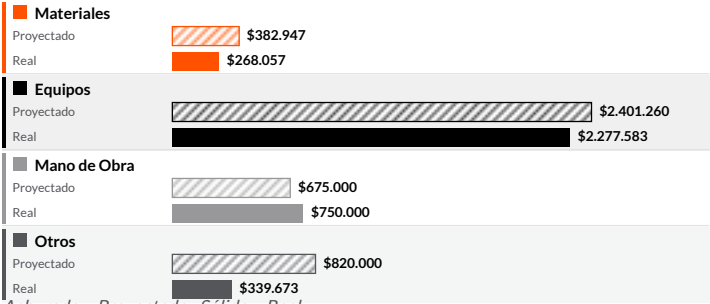

COMPOSICIÓN DEL COSTO REAL

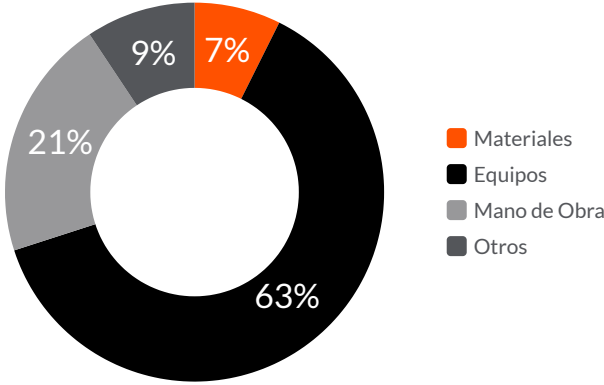

PROYECTOS CONSIDERADOS (SOLO LOS DE DATOS COMPLETOS)

TAG	Proyecto	Avance	Venta	Margen al cierre	Margen %	Nota
CVAL	Caldera Valdivia	100,0%	\$6.020.169	\$2.384.856	39,6%	87/100

INDICADORES COMPLETOS DEL PLAYBOOK (PONDERADOS POR VENTA)

RESULTADO A LA FECHA		
Margen neto %	39,6%	Objetivo playbook: 25%
Desviación % Total	-15,0%	Ideal: cercano a 0%
Ahorro/Sobrecosto Total	\$643.894	Ideal: positivo (ahorro)
Margen por día de ejecución	—	
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA		
Desviación % Materiales	-30,0%	Ideal: cercano a 0%
Desviación % Equipos	-5,2%	Ideal: cercano a 0%
Desviación % MO	11,1%	Ideal: cercano a 0%
Desviación % Otros	-58,6%	Ideal: cercano a 0%
Error del presupuesto %	18,6%	Ideal: cercano a 0%
Ahorro/Sobrecosto Materiales	\$114.890	Ideal: positivo (ahorro)
Ahorro/Sobrecosto Equipos	\$123.677	Ideal: positivo (ahorro)
Ahorro/Sobrecosto MO	\$-75.000	Ideal: positivo (ahorro)
Ahorro/Sobrecosto Otros	\$480.327	Ideal: positivo (ahorro)

PROYECCIÓN AL CIERRE		
Costo estimado al cierre	\$3.635.313	
Margen estimado al cierre	\$2.384.856	
Margen estimado al cierre %	39,6%	Objetivo playbook: 25%
Desviación estimada al cierre %	-15,0%	Sobrecosto sobre +10%
Margen al cierre % (escenario índice de costo)	—	Escenario pesimista
Nota del Proyecto	—	Bueno ≥70 · Excelente ≥85
Evaluación	—	Clasifica la Nota
ESTRUCTURA DEL COSTO REAL		
Costo Materiales % de venta	4,5%	
Costo Equipos % de venta	37,8%	
Costo MO % de venta	12,5%	
Costo Otros % de venta	5,6%	
Estructura % Materiales	7,4%	
Estructura % Equipos	62,7%	
Estructura % MO	20,6%	
Estructura % Otros	9,3%	



Análisis — Categoría Montaje

Categoría de un solo proyecto —Caldera Valdivia— con \$6.020.169 de venta, 39,6% de margen ponderado y Nota 87/100. Es la línea de negocio más pequeña de la cartera (4,2% de la venta) y, al mismo tiempo, la que exhibe la mejor calidad de cotización de toda la empresa: un Error del presupuesto de 18,6% cuando el resto se mueve entre 54,9% y 68,8%.

Fortalezas

- **Error del presupuesto de 18,6%, el mejor registrado en QUEMPIN:** es la única categoría donde el presupuesto acertó por partida y no solo en el total.
- Equipos, que concentra el **62,7% del costo**, se desvió apenas **-5,2%** (\$2.401.260 → \$2.277.583).
- Cerró **-15,0% bajo presupuesto**, con un ahorro de \$643.894 y margen de 39,6%, muy sobre el objetivo de 25%.
- Materiales a **-30,0%** y Otros a **-58,6%**, ambos mejor que el sesgo de la cartera en sus respectivas categorías.
- Ciclo de ejecución de **4 días: el mayor margen por día de ejecución de toda la cartera.**

Debilidades / riesgos

- **Un solo proyecto y un solo cliente:** toda la evidencia de la categoría descansa en una observación, y ninguna conclusión estadística se sostiene sobre $n=1$.
- Margen de 39,6% contra una mediana de cartera de 45,6%: **6 puntos bajo el proyecto típico**, pese a la ejecución más precisa.
- Representa apenas el **4,2% de la venta**: su excelente desempeño no mueve los indicadores consolidados de la empresa.
- **Coexiste con la categoría "Montaje e instalación"**, de nombre casi idéntico y un solo proyecto cada una: **la separación fragmenta el análisis sin aportar distinción clara.**
- Mano de Obra **+11,1%**, el único desvío al alza de la categoría.

Análisis de KPIs

Con un solo proyecto, todos los indicadores de la categoría son los de CVAL, y eso limita la lectura: no se puede distinguir entre una línea de negocio intrínsecamente predecible y una cotización que salió bien una vez. Lo que sí es utilizable es el contraste con el resto de la cartera. Mientras Mantenimiento erró un 73,0% en Materiales y Montaje e instalación un 1.053,1%, aquí la partida dominante se estimó con un error de 5,2%. Ese nivel de precisión existe dentro de la empresa; la pregunta es qué lo produjo y por qué no se repite en las demás categorías.

Qué hacer con esto

1. **Documentar cómo se construyó esta cotización** antes de que se pierda el contexto: es el único caso de la empresa donde el presupuesto describió bien el trabajo por categoría.
2. **Evaluar fusionar "Montaje" y "Montaje e instalación"** en una sola categoría, o definir con precisión qué distingue a una de la otra — hoy son dos líneas de un proyecto cada una.
3. **Buscar un segundo proyecto de Montaje** para validar si la precisión es replicable; con $n=1$ la categoría no permite fijar estándares.
4. **Revisar si el precio de venta dejó margen sin capturar:** 15% de ahorro sobre presupuesto en 4 días de obra sugiere espacio para evaluar el pricing de la línea.
