



Cremación Concepción

Proyectos completos 1 Cliente recurrente No Clasificación Clientes de oportunidad


\$6.518.650
Venta acumulada (sin IVA)
4,6% de la venta de la cartera

\$1.255.488
Margen acumulado (al cierre)


19,3%
Margen %
Objetivo 25%

Clientes de oportunidad
Clasificación
1 proyecto(s) completos

PRESUPUESTO VS. GASTO REAL POR CATEGORÍA

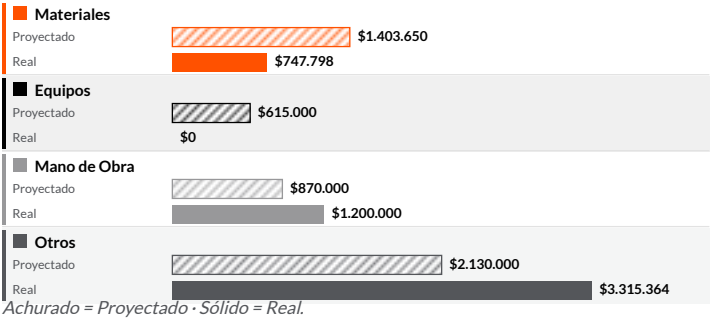

COMPOSICIÓN DEL COSTO REAL

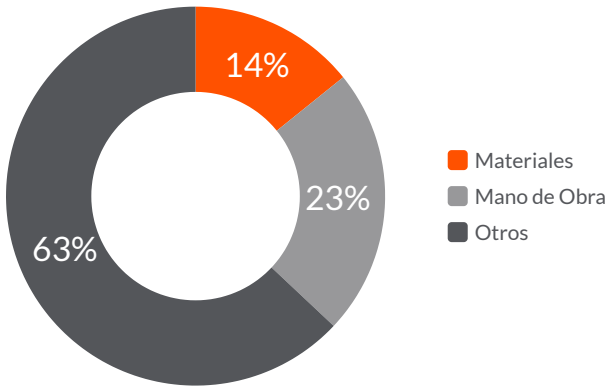

PROYECTOS CONSIDERADOS (SOLO LOS DE DATOS COMPLETOS)

TAG	Proyecto	Avance	Venta	Margen al cierre	Margen %	Nota
CREM	Cremación Concepción	100,0%	\$6.518.650	\$1.255.488	19,3%	63/100

INDICADORES COMPLETOS DEL PLAYBOOK (PONDERADOS POR VENTA)

RESULTADO A LA FECHA		
Margen neto %	19,3%	Objetivo playbook: 25%
Desviación % Total	4,9%	Ideal: cercano a 0%
Ahorro/Sobrecosto Total	\$-244.512	Ideal: positivo (ahorro)
Margen por día de ejecución	—	
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA		
Desviación % Materiales	-46,7%	Ideal: cercano a 0%
Desviación % Equipos	-100,0%	Ideal: cercano a 0%
Desviación % MO	37,9%	Ideal: cercano a 0%
Desviación % Otros	55,7%	Ideal: cercano a 0%
Error del presupuesto %	55,5%	Ideal: cercano a 0%
Ahorro/Sobrecosto Materiales	\$655.852	Ideal: positivo (ahorro)
Ahorro/Sobrecosto Equipos	\$615.000	Ideal: positivo (ahorro)
Ahorro/Sobrecosto MO	\$-330.000	Ideal: positivo (ahorro)
Ahorro/Sobrecosto Otros	\$-1.185.364	Ideal: positivo (ahorro)

PROYECCIÓN AL CIERRE		
Costo estimado al cierre	\$5.263.162	
Margen estimado al cierre	\$1.255.488	
Margen estimado al cierre %	19,3%	Objetivo playbook: 25%
Desviación estimada al cierre %	4,9%	Sobrecosto sobre +10%
Margen al cierre % (escenario índice de costo)	—	Escenario pesimista
Nota del Proyecto	—	Bueno ≥70 · Excelente ≥85
Evaluación	—	Clasifica la Nota
ESTRUCTURA DEL COSTO REAL		
Costo Materiales % de venta	11,5%	
Costo Equipos % de venta	0,0%	
Costo MO % de venta	18,4%	
Costo Otros % de venta	50,9%	
Estructura % Materiales	14,2%	
Estructura % Equipos	0,0%	
Estructura % MO	22,8%	
Estructura % Otros	63,0%	



Análisis — Cliente Cremación Concepción

El cliente de menor rentabilidad de la cartera: \$6.518.650 de venta acumulada con 19,3% de margen ponderado, el único por debajo del objetivo de 25% del playbook. Clasificado como Cliente de oportunidad, con un solo proyecto cerrado y Nota 63/100. La relación deja \$1.255.488 de margen, menos de la mitad de lo que dejaría un proyecto de tamaño equivalente al margen mediano de la empresa.

Fortalezas

- Venta de **\$6.518.650**, el tercer proyecto individual más grande entre los clientes de un solo trabajo: **el ticket es atractivo aunque el margen no lo sea**.
- Materiales cerró en **-46,7% bajo presupuesto** contra un sesgo de empresa de +16,6%: **la partida mejor controlada de la relación**.
- El sobre costo total se contuvo en **+4,9%**, sin alertas activas en el proyecto.
- Ejecución acotada de **31 días** en temporada de baja actividad (diciembre-enero), aprovechando capacidad ociosa.

Debilidades / riesgos

- **19,3% de margen: 5,7 puntos bajo el objetivo y 26,3 bajo la mediana de la cartera**. Es el único cliente que no alcanza el umbral mínimo de rentabilidad.
- **"Otros" costó \$3.315.364 contra \$2.130.000 presupuestados (+55,7%)** y consumió el 63% del costo total: **toda la pérdida de margen está en una sola partida**.
- **Equipos se presupuestó en \$615.000 y se ejecutó en \$0**: probable migración de costo hacia "Otros", lo que indica un problema de clasificación más que de estimación.
- Mano de Obra **+37,9%** sobre presupuesto, el segundo mayor desvío de MO de la cartera.
- **No es cliente recurrente**: sin volumen adicional, la relación no compensa su baja rentabilidad.

Análisis de KPIs

Con Nota 63/100 este es el segundo peor desempeño de la cartera, solo por delante de Junji's Valparaíso, y a diferencia de aquel no tiene el atenuante del tamaño. La combinación de Equipos en -100% y Otros en +55,7% apunta a que el costo real existió pero quedó registrado en la partida equivocada; si así fuera, el presupuesto no estuvo tan errado como parece, pero el margen sí es real y sí es bajo. Dentro de Mantenimiento —categoría que promedia 29,8%— este cliente queda 10,5 puntos por debajo incluso de su propia línea de negocio.

Qué hacer con esto

1. **Auditar la composición de los \$3.315.364 de "Otros"** antes de cotizar cualquier trabajo nuevo con este cliente: sin saber qué hay ahí dentro, la próxima cotización repetirá el error.
2. **Recotizar con un piso de 25% de margen** o declinar: a 19,3% la relación consume capacidad operativa que rinde más en I+D+i (58,8%) o Montaje e instalación (53,8%).
3. **Corregir la tarifa de mano de obra para trabajos de cremación**: +37,9% sobre lo previsto sugiere que la complejidad del servicio está subestimada en el modelo de horas.
