



Cliente Microturbina LER

Generado el 24-09-2026

Microturbina LER

Proyectos completos 1 Cliente recurrente No Clasificación Clientes potenciales

\$5.325.325

Venta acumulada (sin IVA)
3,7% de la venta de la cartera

\$2.750.148

Margen acumulado (al cierre)


51,6%

Margen %
Objetivo 25%


Clientes
potenciales

Clasificación
1 proyecto(s) completos

PRESUPUESTO VS. GASTO REAL POR CATEGORÍA

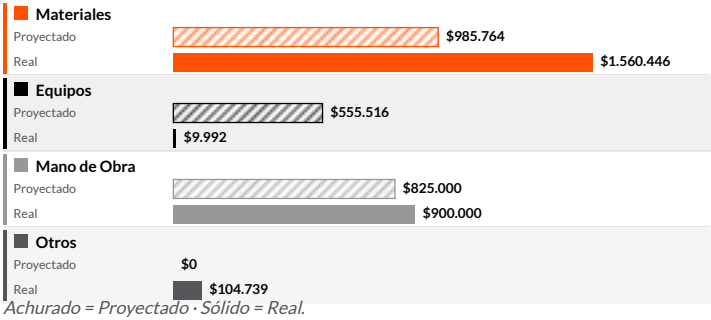

COMPOSICIÓN DEL COSTO REAL

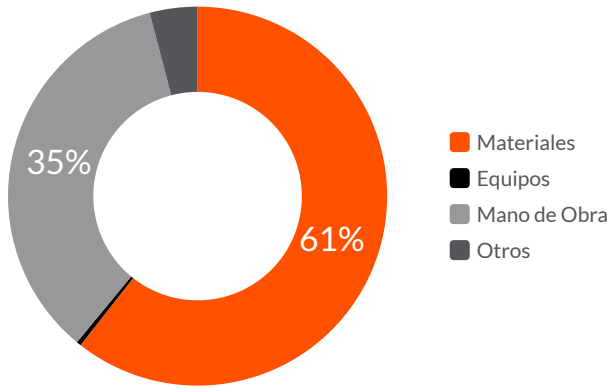

PROYECTOS CONSIDERADOS (SOLO LOS DE DATOS COMPLETOS)

TAG	Proyecto	Avance	Venta	Margen al cierre	Margen %	Nota
MLER	Microturbina LER	100,0%	\$5.325.325	\$2.750.148	51,6%	82/100

INDICADORES COMPLETOS DEL PLAYBOOK (PONDERADOS POR VENTA)

RESULTADO A LA FECHA		
Margen neto %	51,6%	Objetivo playbook: 25%
Desviación % Total	8,8%	Ideal: cercano a 0%
Ahorro/Sobrecosto Total	-\$208.897	Ideal: positivo (ahorro)
Margen por día de ejecución	—	
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA		
Desviación % Materiales	58,3%	Ideal: cercano a 0%
Desviación % Equipos	-98,2%	Ideal: cercano a 0%
Desviación % MO	9,1%	Ideal: cercano a 0%
Desviación % Otros	—	Ideal: cercano a 0%
Error del presupuesto %	54,9%	Ideal: cercano a 0%
Ahorro/Sobrecosto Materiales	-\$574.682	Ideal: positivo (ahorro)
Ahorro/Sobrecosto Equipos	\$545.524	Ideal: positivo (ahorro)
Ahorro/Sobrecosto MO	-\$75.000	Ideal: positivo (ahorro)
Ahorro/Sobrecosto Otros	-\$104.739	Ideal: positivo (ahorro)

PROYECCIÓN AL CIERRE		
Costo estimado al cierre	\$2.575.177	
Margen estimado al cierre	\$2.750.148	
Margen estimado al cierre %	51,6%	Objetivo playbook: 25%
Desviación estimada al cierre %	8,8%	Sobrecosto sobre +10%
Margen al cierre % (escenario índice de costo)	—	Escenario pesimista
Nota del Proyecto	—	Bueno ≥70 · Excelente ≥85
Evaluación	—	Clasifica la Nota
ESTRUCTURA DEL COSTO REAL		
Costo Materiales % de venta	29,3%	
Costo Equipos % de venta	0,2%	
Costo MO % de venta	16,9%	
Costo Otros % de venta	2,0%	
Estructura % Materiales	60,6%	
Estructura % Equipos	0,4%	
Estructura % MO	34,9%	
Estructura % Otros	4,1%	



Análisis — Cliente Microturbina LER

Cliente de I+D+i con \$5.325.325 de venta y 51,6% de margen ponderado, 6 puntos sobre la mediana de la cartera. Clasificado como Cliente potencial, con Nota 82/100 y un sobrecosto contenido en +8,8%. Pertenece a la categoría más rentable de la empresa (58,8% ponderado), lo que lo convierte en el tipo de relación que conviene multiplicar.

Fortalezas

- Margen acumulado de **\$2.750.148 (51,6%)**, más del doble del objetivo de 25% del playbook.
- **Sobrecosto total de solo +8,8%**, bajo el umbral de alerta de +10%: **sin alertas de desviación en la relación**.
- Mano de Obra se desvió apenas **+9,1%** (\$825.000 → \$900.000), uno de los controles de horas más ajustados de la cartera.
- Aporta el **3,7% de la venta y el 5,0% del margen acumulado: rinde por sobre su peso en la cartera**.

Debilidades / riesgos

- Materiales se pasó **+58,3%** (\$985.764 → \$1.560.446), 42 puntos sobre el sesgo de la empresa (+16,6%): **el insumo del desarrollo se subestimó de forma significativa**.
- **Equipos se ejecutó en \$9.992 contra \$555.516 presupuestados (-98,2%)**: el gasto migró a Materiales casi peso por peso, señal de que la cotización no anticipó cómo se haría el trabajo.
- "Otros" registra **\$104.739 sin presupuesto asignado**, fuera de todo control de desviación.
- **No es cliente recurrente** y su proyecto ya está cerrado: la continuidad de la relación depende de un desarrollo nuevo, no de mantenimiento sobre lo entregado.

Análisis de KPIs

El Error del presupuesto de 54,9% contrasta con una desviación total de solo +8,8%, y la explicación está en el traslado Equipos→Materiales: dos errores grandes de signo contrario que se anularon en el total. En I+D+i ese patrón se repite a nivel de categoría (Equipos -64,7%, Materiales +17,8% sobre dos proyectos), de modo que no es un descuido puntual sino una característica del tipo de trabajo que el modelo de cotización aún no refleja. Con margen de 51,6% y ciclo de 90 días, la relación es rentable incluso con esa imprecisión.

Qué hacer con esto

1. **Buscar activamente un segundo desarrollo con este cliente**: I+D+i es la categoría más rentable de la empresa y este es uno de sus dos únicos clientes.
2. **Cotizar el próximo trabajo con el reparto Equipos/Materiales corregido**, trasladando presupuesto hacia Materiales según lo observado en los dos proyectos de la categoría.
3. **Evaluar servicios de soporte o escalamiento sobre la microturbina entregada** — es la vía más directa para convertir una venta puntual en una relación recurrente.
