



Cliente Putaendo Hospital Pinel

Generado el 24-09-2026

Putaendo Hospital Pinel

Proyectos completos 1 Cliente recurrente No Clasificación Clientes estratégicos

\$16.801.799

Venta acumulada (sin IVA)
11,8% de la venta de la cartera

\$9.038.598

Margen acumulado (al cierre)


53,8%

Margen %
Objetivo 25%


**Clientes
estratégicos**

Clasificación
1 proyecto(s) completos

PRESUPUESTO VS. GASTO REAL POR CATEGORÍA

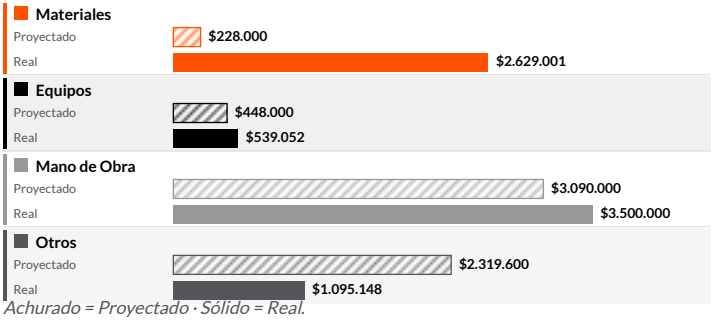

COMPOSICIÓN DEL COSTO REAL

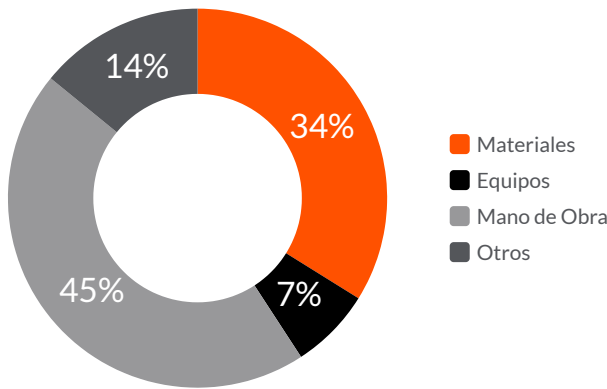

PROYECTOS CONSIDERADOS (SOLO LOS DE DATOS COMPLETOS)

TAG	Proyecto	Avance	Venta	Margen al cierre	Margen %	Nota
HPIN	Putaendo Hospital Pinel	100,0%	\$16.801.799	\$9.038.598	53,8%	64/100

INDICADORES COMPLETOS DEL PLAYBOOK (PONDERADOS POR VENTA)

RESULTADO A LA FECHA		
Margen neto %	53,8%	Objetivo playbook: 25%
Desviación % Total	27,6%	Ideal: cercano a 0%
Ahorro/Sobrecosto Total	\$-1.677.601	Ideal: positivo (ahorro)
Margen por día de ejecución	—	
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA		
Desviación % Materiales	1.053,1%	Ideal: cercano a 0%
Desviación % Equipos	20,3%	Ideal: cercano a 0%
Desviación % MO	13,3%	Ideal: cercano a 0%
Desviación % Otros	-52,8%	Ideal: cercano a 0%
Error del presupuesto %	67,8%	Ideal: cercano a 0%
Ahorro/Sobrecosto Materiales	\$-2.401.001	Ideal: positivo (ahorro)
Ahorro/Sobrecosto Equipos	\$-91.052	Ideal: positivo (ahorro)
Ahorro/Sobrecosto MO	\$-410.000	Ideal: positivo (ahorro)
Ahorro/Sobrecosto Otros	\$1.224.452	Ideal: positivo (ahorro)

PROYECCIÓN AL CIERRE		
Costo estimado al cierre	\$7.763.201	
Margen estimado al cierre	\$9.038.598	
Margen estimado al cierre %	53,8%	Objetivo playbook: 25%
Desviación estimada al cierre %	27,6%	Sobrecosto sobre +10%
Margen al cierre % (escenario índice de costo)	—	Escenario pesimista
Nota del Proyecto	—	Bueno ≥70 · Excelente ≥85
Evaluación	—	Clasifica la Nota
ESTRUCTURA DEL COSTO REAL		
Costo Materiales % de venta	15,6%	
Costo Equipos % de venta	3,2%	
Costo MO % de venta	20,8%	
Costo Otros % de venta	6,5%	
Estructura % Materiales	33,9%	
Estructura % Equipos	6,9%	
Estructura % MO	45,1%	
Estructura % Otros	14,1%	



Análisis — Cliente Putaendo Hospital Pinel

Segundo cliente por tamaño: \$16.801.799 de venta (11,8% de la cartera) y \$9.038.598 de margen, con 53,8% ponderado. Clasificado como Cliente estratégico. La rentabilidad es sólida, pero se logró pese a la peor estimación de materiales registrada en la empresa: \$228.000 presupuestados contra \$2.629.001 reales, un desvío de +1.053,1%.

Fortalezas

- **Margen acumulado de \$9.038.598, el segundo mayor de la cartera** en monto absoluto, con 53,8% ponderado contra una mediana de 45,6%.
- **El precio de venta absorbió \$1.677.601 de sobrecosto sin comprometer la rentabilidad:** la oferta tenía holgura suficiente para resistir un error grave de estimación.
- Otros cerró **-52,8% bajo presupuesto** (\$2.319.600 → \$1.095.148), aportando \$1.224.452 que compensaron parte del desborde.
- Único cliente de la categoría **Montaje e instalación**, que promedia 53,8% de margen: **define por sí solo el estándar de esa línea de negocio.**

Debilidades / riesgos

- **Materiales costó 11,5 veces lo presupuestado (+1.053,1%):** contra un sesgo de empresa de +16,6%, es un error de alcance específico de esta cotización, no una tendencia general.
- **Alerta activa: sobrecosto de +27,6%,** al borde del umbral de +30% donde el componente de control de la Nota llega a cero. La Nota quedó en **64/100**, bajo la mediana de 81,5.
- **Alerta activa: 100% de avance con fecha de cierre al 03-03-2027.** Uno de los dos datos está desactualizado y la relación figura formalmente en desarrollo.
- Error del presupuesto de **67,8%:** ninguna de las cuatro categorías acertó, con MO en +13,3% y Equipos en +20,3% además del desborde de Materiales.
- **No es cliente recurrente:** es el segundo mayor de la cartera y tiene un solo proyecto.

Análisis de KPIs

La distancia entre un margen de 53,8% —muy bueno— y una Nota de 64/100 —bajo la mediana— es el punto central de esta relación. La Nota pondera 70% margen y 30% control de costos, y aquí el control es el peor entre los proyectos cerrados. Dicho de otro modo: el cliente fue rentable, pero el proceso que produjo esa rentabilidad no es repetible. Si el próximo trabajo se cotiza con la misma línea de materiales y el precio de mercado no deja la misma holgura, el resultado sería muy distinto. Con este cliente concentrando el 11,8% de la venta, ese riesgo es material.

Qué hacer con esto

1. **Reconstruir el estándar de materiales de la categoría con el costo real (\$2.629.001)** antes de cotizar otro hospital — es la corrección de mayor impacto disponible hoy.
2. **Regularizar las fechas del proyecto** para cerrar la relación formalmente y habilitar el cálculo de margen por día.
3. **Aprovechar la credencial hospitalaria para una segunda venta:** es cliente estratégico por margen, y el segmento de salud pública ya concentra tres clientes de la cartera.
4. **No proyectar 53,8% como margen estructural de Montaje e instalación** hasta tener un segundo proyecto que lo confirme con el costo correcto.
