



Proyecto Cesfam Constitución

Generado el 24-09-2026

Cesfam Constitución

CERRADO

TAG CCON

Cliente Cesfam Constitución

Categoría Mantenimiento

Avance 100,0%

Inicio 29-05-2026

Cierre 29-06-2026

81/100

Nota del Proyecto
Bueno

28,0%

Margen estimado al cierre
Objetivo 25% · mediana cartera
45,6%

0,2%

Desviación estimada al cierre
Presupuesto \$4.009.828


\$5.581.223

Monto de Venta (sin IVA)
3,9% de la venta de la cartera

ALERTAS DE DATOS Y DE PRESUPUESTO


- Equipos tiene gasto real pero presupuesto 0: su desviación no se puede medir.

PRESUPUESTO VS. GASTO REAL POR CATEGORÍA

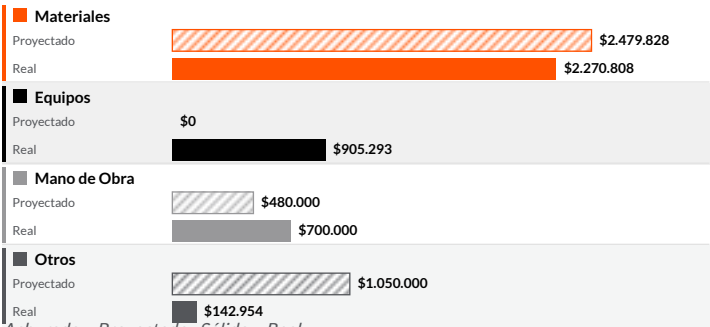

Achurado = Proyectado · Sólido = Real.

COMPOSICIÓN DEL COSTO REAL

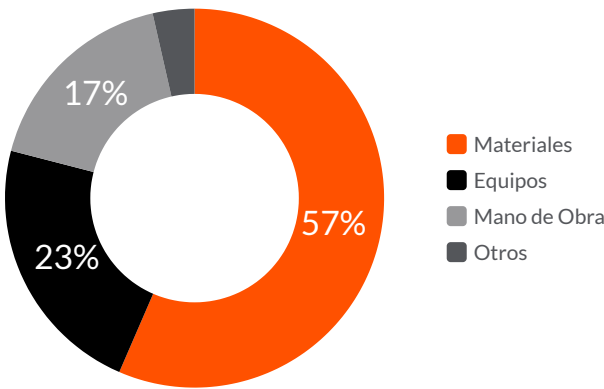

DATOS CLAVE

Concepto	Monto
Monto de Venta (sin IVA)	\$5.581.223
Costo presupuestado	\$4.009.828
Costo real a la fecha	\$4.019.055
Costo estimado al cierre	\$4.019.055
Margen estimado al cierre	\$1.562.168

INDICADORES COMPLETOS DEL PLAYBOOK

RESULTADO A LA FECHA		
Margen neto %	28,0%	Objetivo playbook: 25%
Desviación % Total	0,2%	Ideal: cercano a 0%
Ahorro/Sobrecosto Total	\$-9.227	Ideal: positivo (ahorro)
Margen por día de ejecución	\$50.393	
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA		
Desviación % Materiales	-8,4%	Ideal: cercano a 0%
Desviación % Equipos	—	Ideal: cercano a 0%
Desviación % MO	45,8%	Ideal: cercano a 0%
Desviación % Otros	-86,4%	Ideal: cercano a 0%
Error del presupuesto %	55,9%	Ideal: cercano a 0%
Ahorro/Sobrecosto Materiales	\$209.020	Ideal: positivo (ahorro)
Ahorro/Sobrecosto Equipos	\$-905.293	Ideal: positivo (ahorro)
Ahorro/Sobrecosto MO	\$-220.000	Ideal: positivo (ahorro)
Ahorro/Sobrecosto Otros	\$907.046	Ideal: positivo (ahorro)

PROYECCIÓN AL CIERRE		
Costo estimado al cierre	\$4.019.055	
Margen estimado al cierre	\$1.562.168	
Margen estimado al cierre %	28,0%	Objetivo playbook: 25%
Desviación estimada al cierre %	0,2%	Sobrecosto sobre +10%
Margen al cierre % (escenario índice de costo)	28,0%	Escenario pesimista
Nota del Proyecto	81/100	Bueno ≥70 · Excelente ≥85
Evaluación	Bueno	Clasifica la Nota
ESTRUCTURA DEL COSTO REAL		
Costo Materiales % de venta	40,7%	
Costo Equipos % de venta	16,2%	
Costo MO % de venta	12,5%	
Costo Otros % de venta	2,6%	
Estructura % Materiales	56,5%	
Estructura % Equipos	22,5%	
Estructura % MO	17,4%	
Estructura % Otros	3,6%	



Análisis — Proyecto Cesfam Constitución (CCON)

Proyecto cerrado con un margen de 28,0%, muy por debajo de la mediana de 45,6% de la cartera. La desviación total de +0,2% sugiere un presupuesto casi perfecto, pero es una coincidencia: el error real del presupuesto fue de 55,9%, porque un gasto de \$905.293 en Equipos que nunca se presupuestó quedó compensado por un ahorro de \$907.046 en Otros. El total calzó; ninguna de las cuatro categorías lo hizo.

Fortalezas

- Materiales cerró en **-8,4% bajo presupuesto**, contra un sesgo de cartera de +16,6%: **la cotización de materiales de este proyecto fue 25 puntos mejor que el promedio de la empresa.**
- El proyecto se ejecutó en **31 días** (29-05 al 29-06-2026) y cerró con **Nota 81/100**, en línea con la mediana de la cartera (81,5).
- Margen absoluto de **\$1.562.168** sobre una venta de \$5.581.223 — aporta el 3,9% de la venta de la cartera sin haber consumido atención de gestión extraordinaria.

Debilidades / riesgos

- **Equipos se presupuestó en \$0 y costó \$905.293**: es el 22,5% del costo total del proyecto y no existía en la cotización. Su desviación no se puede medir porque no hay contra qué compararla.
- Mano de Obra cerró **+45,8% sobre presupuesto** (\$480.000 → \$700.000) contra un sesgo de cartera de apenas +1,0%: **el desvío es propio de este proyecto, no una tendencia de la empresa.**
- Otros se presupuestó en \$1.050.000 y costó \$142.954 (**-86,4%**): una partida sobredimensionada en 7 veces enmascaró los dos errores anteriores.
- Margen de 28,0% contra una mediana de cartera de 45,6%: **17,6 puntos por debajo del proyecto típico de QUEMPIN.**

Análisis de KPIs

La Nota de 81/100 y la Desviación al cierre de +0,2% dan una lectura tranquilizadora que el Error del presupuesto (55,9%) desmiente. Ese indicador existe justamente para esto: suma los errores por categoría en valor absoluto, sin dejar que se cancelen entre sí. Con más de la mitad del presupuesto mal repartido, el resultado de este proyecto se explica mejor por compensación que por control. El margen de 28,0% supera el objetivo de 25% del playbook, pero queda en el cuartil inferior de la cartera, y en Mantenimiento —donde el margen ponderado es 29,8%— confirma que es la categoría de menor rentabilidad de la empresa.

Qué hacer con esto

1. **Incorporar Equipos como partida obligatoria en toda cotización de Mantenimiento**: es el segundo proyecto de la cartera con gasto real en Equipos y presupuesto cero, y sin línea base ningún control de desviación funciona.
2. **Revisar el criterio de dimensionamiento de "Otros"**: un sobredimensionamiento de 7x no es conservadurismo, es holgura que oculta errores en el resto del presupuesto.
3. **No usar la desviación total como indicador de calidad de cotización** en este proyecto ni en ninguno con Error del presupuesto sobre 30% — leer el Error del presupuesto primero.
