



# Proyecto Cremación Concepción

Generado el 24-09-2026

## Cremación Concepción

CERRADO

TAG CREM

Cliente Cremación Concepción

Categoría Mantenimiento

Avance 100,0%

Inicio 23-12-2025

Cierre 23-01-2026

63/100

Nota del Proyecto  
Aprobado

19,3%

Margen estimado al cierre  
Objetivo 25% · mediana cartera  
45,6%


4,9%

Desviación estimada al cierre  
Presupuesto \$5.018.650


\$6.518.650

Monto de Venta (sin IVA)  
4,6% de la venta de la cartera

### PRESUPUESTO VS. GASTO REAL POR CATEGORÍA

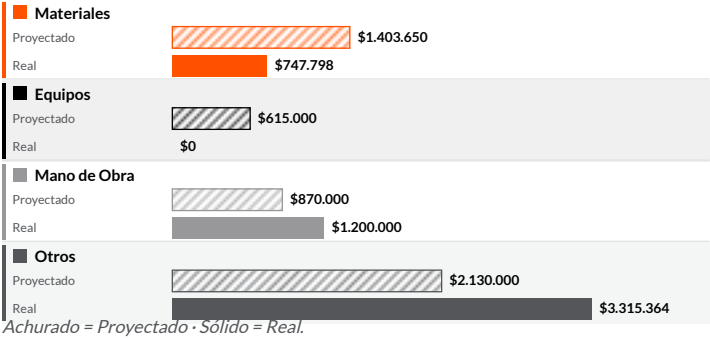

### COMPOSICIÓN DEL COSTO REAL

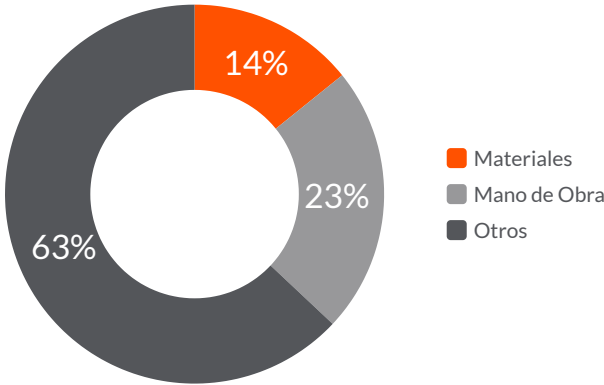

### DATOS CLAVE

| Concepto                  | Monto       |
|---------------------------|-------------|
| Monto de Venta (sin IVA)  | \$6.518.650 |
| Costo presupuestado       | \$5.018.650 |
| Costo real a la fecha     | \$5.263.162 |
| Costo estimado al cierre  | \$5.263.162 |
| Margen estimado al cierre | \$1.255.488 |

### INDICADORES COMPLETOS DEL PLAYBOOK

| RESULTADO A LA FECHA         |               |                          |
|------------------------------|---------------|--------------------------|
| Margen neto %                | 19,3%         | Objetivo playbook: 25%   |
| Desviación % Total           | 4,9%          | Ideal: cercano a 0%      |
| Ahorro/Sobrecosto Total      | -\$-244.512   | Ideal: positivo (ahorro) |
| Margen por día de ejecución  | \$40.500      |                          |
| PRESUPUESTO POR CATEGORÍA    |               |                          |
| Desviación % Materiales      | -46,7%        | Ideal: cercano a 0%      |
| Desviación % Equipos         | -100,0%       | Ideal: cercano a 0%      |
| Desviación % MO              | 37,9%         | Ideal: cercano a 0%      |
| Desviación % Otros           | 55,7%         | Ideal: cercano a 0%      |
| Error del presupuesto %      | 55,5%         | Ideal: cercano a 0%      |
| Ahorro/Sobrecosto Materiales | \$655.852     | Ideal: positivo (ahorro) |
| Ahorro/Sobrecosto Equipos    | \$615.000     | Ideal: positivo (ahorro) |
| Ahorro/Sobrecosto MO         | -\$-330.000   | Ideal: positivo (ahorro) |
| Ahorro/Sobrecosto Otros      | -\$-1.185.364 | Ideal: positivo (ahorro) |

| PROYECCIÓN AL CIERRE                           |             |                             |
|------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| Costo estimado al cierre                       | \$5.263.162 |                             |
| Margen estimado al cierre                      | \$1.255.488 |                             |
| Margen estimado al cierre %                    | 19,3%       | Objetivo playbook: 25%      |
| Desviación estimada al cierre %                | 4,9%        | Sobrecosto sobre +10%       |
| Margen al cierre % (escenario índice de costo) | 19,3%       | Escenario pesimista         |
| Nota del Proyecto                              | 63/100      | Bueno ≥ 70 · Excelente ≥ 85 |
| Evaluación                                     | Aprobado    | Clasifica la Nota           |
| ESTRUCTURA DEL COSTO REAL                      |             |                             |
| Costo Materiales % de venta                    | 11,5%       |                             |
| Costo Equipos % de venta                       | 0,0%        |                             |
| Costo MO % de venta                            | 18,4%       |                             |
| Costo Otros % de venta                         | 50,9%       |                             |
| Estructura % Materiales                        | 14,2%       |                             |
| Estructura % Equipos                           | 0,0%        |                             |
| Estructura % MO                                | 22,8%       |                             |
| Estructura % Otros                             | 63,0%       |                             |



## Análisis — Proyecto Cremación Concepción (CREM)

El proyecto de menor margen de la cartera: 19,3%, por debajo del objetivo de 25% del playbook y a 26,3 puntos de la mediana de 45,6%. El sobrecosto de +4,9% es modesto, pero se concentra íntegramente en "Otros", que costó \$3.315.364 contra \$2.130.000 presupuestados — y "Otros" es precisamente la categoría donde el resto de la cartera ahorra un 21,5%.

### Fortalezas

- Materiales cerró en **\$747.798 contra \$1.403.650 presupuestados (-46,7%)**, muy por debajo del sesgo de cartera de +16,6%: **en la única categoría donde la empresa sistemáticamente se pasa, este proyecto ahorró casi la mitad.**
- Ejecución rápida y acotada: **31 días** entre el 23-12-2025 y el 23-01-2026, en plena temporada de baja actividad.
- El sobrecosto total quedó en **+4,9%**, bien dentro del umbral de alerta de +10% — **ninguna alerta activa en el proyecto.**

### Debilidades / riesgos

- **"Otros" se desbordó en +55,7% (\$1.185.364 por sobre el presupuesto)** y por sí solo explica todo el sobrecosto del proyecto: sin él, CREM habría cerrado un 14% bajo presupuesto.
- **Equipos se presupuestó en \$615.000 y se gastó \$0 (-100%)**: o el trabajo se hizo sin los equipos previstos, o ese costo migró a "Otros" sin quedar registrado como tal.
- Mano de Obra **+37,9%** (\$870.000 → \$1.200.000) contra un sesgo de cartera de +1,0%: **el segundo mayor desvío de MO de la cartera.**
- Error del presupuesto de **55,5%**: más de la mitad del presupuesto quedó mal asignado entre categorías, con Nota 63/100, la segunda más baja de la cartera.

### Análisis de KPIs

Con margen de 19,3% este es el único proyecto cerrado de la cartera que no alcanza el objetivo de 25%, y su Nota de 63/100 lo refleja: el componente de margen no llega al tramo alto de la curva y el control de costos pierde puntos por el sobrecosto. La lectura importante no es el -4,9% de desviación total sino la migración de gasto: \$615.000 presupuestados en Equipos desaparecieron y \$1.185.364 aparecieron en Otros. Esa combinación es la firma típica de un costo mal clasificado, no de un costo mal estimado — y si es así, el problema es de codificación contable, no de cotización.

### Qué hacer con esto

1. **Auditar qué hay dentro de los \$3.315.364 de "Otros"** antes de cotizar el próximo proyecto de Cremación: si contiene arriendo de equipos, el presupuesto de Equipos no falló, falló la clasificación.
2. **Tratar 19,3% como el piso inaceptable de la cartera**: cualquier cotización de Mantenimiento que proyecte menos de 25% de margen debería requerir aprobación explícita antes de presentarse.
3. **Revisar la tarifa de mano de obra de este tipo de servicio**: dos proyectos de Mantenimiento cerrados (CREM +37,9% y CCON +45,8%) se pasaron en MO muy por sobre el sesgo de la empresa.
