



Proyecto Caldera Valdivia

Generado el 24-09-2026

Caldera Valdivia

CERRADO

TAG CVAL

Cliente Caldera Valdivia

Categoría Montaje

Avance 100,0%

Inicio 20-07-2026

Cierre 24-07-2026

87/100

Nota del Proyecto
Excelente

39,6%

Margen estimado al cierre
Objetivo 25% · mediana cartera
45,6%


-15,0%

Desviación estimada al cierre
Presupuesto \$4.279.207


\$6.020.169

Monto de Venta (sin IVA)
4,2% de la venta de la cartera

PRESUPUESTO VS. GASTO REAL POR CATEGORÍA

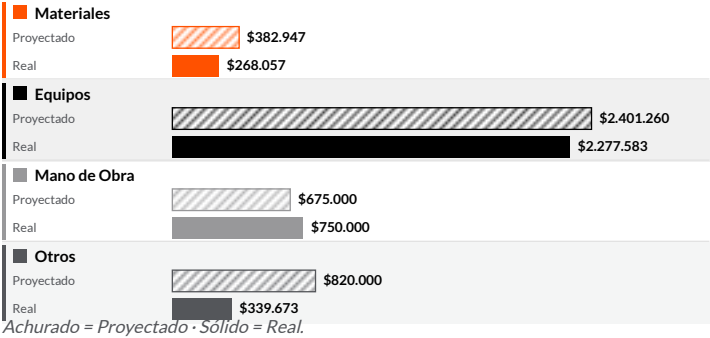

COMPOSICIÓN DEL COSTO REAL

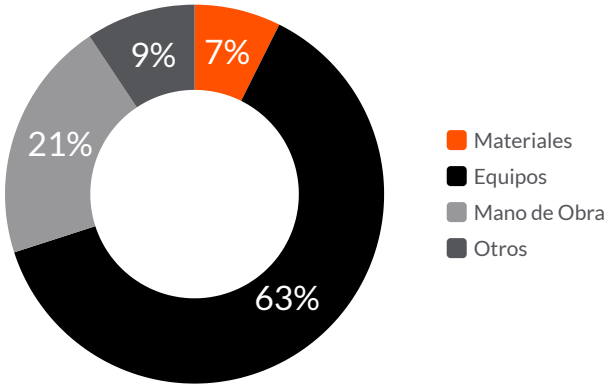

DATOS CLAVE

Concepto	Monto
Monto de Venta (sin IVA)	\$6.020.169
Costo presupuestado	\$4.279.207
Costo real a la fecha	\$3.635.313
Costo estimado al cierre	\$3.635.313
Margen estimado al cierre	\$2.384.856

INDICADORES COMPLETOS DEL PLAYBOOK

RESULTADO A LA FECHA		
Margen neto %	39,6%	Objetivo playbook: 25%
Desviación % Total	-15,0%	Ideal: cercano a 0%
Ahorro/Sobrecosto Total	\$643.894	Ideal: positivo (ahorro)
Margen por día de ejecución	\$596.214	
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA		
Desviación % Materiales	-30,0%	Ideal: cercano a 0%
Desviación % Equipos	-5,2%	Ideal: cercano a 0%
Desviación % MO	11,1%	Ideal: cercano a 0%
Desviación % Otros	-58,6%	Ideal: cercano a 0%
Error del presupuesto %	18,6%	Ideal: cercano a 0%
Ahorro/Sobrecosto Materiales	\$114.890	Ideal: positivo (ahorro)
Ahorro/Sobrecosto Equipos	\$123.677	Ideal: positivo (ahorro)
Ahorro/Sobrecosto MO	\$-75.000	Ideal: positivo (ahorro)
Ahorro/Sobrecosto Otros	\$480.327	Ideal: positivo (ahorro)

PROYECCIÓN AL CIERRE		
Costo estimado al cierre	\$3.635.313	
Margen estimado al cierre	\$2.384.856	
Margen estimado al cierre %	39,6%	Objetivo playbook: 25%
Desviación estimada al cierre %	-15,0%	Sobrecosto sobre +10%
Margen al cierre % (escenario índice de costo)	39,6%	Escenario pesimista
Nota del Proyecto	87/100	Bueno ≥ 70 · Excelente ≥ 85
Evaluación	Excelente	Clasifica la Nota
ESTRUCTURA DEL COSTO REAL		
Costo Materiales % de venta	4,5%	
Costo Equipos % de venta	37,8%	
Costo MO % de venta	12,5%	
Costo Otros % de venta	5,6%	
Estructura % Materiales	7,4%	
Estructura % Equipos	62,7%	
Estructura % MO	20,6%	
Estructura % Otros	9,3%	



Análisis — Proyecto Caldera Valdivia (CVAL)

El proyecto mejor cotizado de toda la cartera: un Error del presupuesto de 18,6% cuando el resto de los proyectos se mueve entre 54,9% y 68,8%. Cerró un 15,0% bajo presupuesto, con margen de 39,6% y Nota 87/100 (Excelente). No es el de mayor margen, pero sí aquel donde lo que se prometió y lo que ocurrió se parecen más.

Fortalezas

- **Error del presupuesto de 18,6%, el mejor de la cartera** — un tercio del siguiente mejor proyecto (CVAL 18,6% vs. MLER 54,9%): **las cuatro categorías se estimaron bien, no solo el total.**
- Equipos, que concentra el 62,7% del costo real (\$2.277.583), se desvió solo **-5,2%** respecto de lo presupuestado: **la partida dominante del proyecto se cotizó con precisión casi exacta.**
- Ahorro de **\$643.894 sobre el presupuesto (-15,0%)**, con margen de 39,6% contra un objetivo de 25%.
- Ejecución de **solo 4 días** (20-07 al 24-07-2026): el proyecto de ciclo más corto de la cartera, lo que maximiza el margen por día de ejecución.

Debilidades / riesgos

- Margen de 39,6% contra una mediana de cartera de 45,6%: **6 puntos por debajo del proyecto típico**, pese a ser el mejor ejecutado.
- Otros cerró **-58,6% bajo presupuesto** (\$820.000 → \$339.673): la única partida con holgura significativa, y la que más espacio deja para ajustar el precio de venta hacia abajo si hiciera falta competir.
- Mano de Obra **+11,1%**, el tercer desvío consecutivo de MO al alza entre los proyectos cerrados: **una tendencia que el sesgo de cartera (+1,0%) todavía no recoge porque otros proyectos la compensan.**
- Venta de \$6.020.169, apenas el **4,2% de la cartera**: un modelo excelente pero de bajo impacto absoluto mientras no se repita.

Análisis de KPIs

La Nota de 87/100 ubica a CVAL en el tramo Excelente pese a tener un margen inferior a la mediana, y eso es correcto: la Nota pondera 70% margen estimado al cierre y 30% control de desviación, y aquí el control es impecable (-15,0%, muy por dentro del presupuesto). Es el caso opuesto a CCON, donde una desviación total casi nula escondía un presupuesto mal repartido. La diferencia la marca el Error del presupuesto: 18,6% aquí contra 55,9% allá. Como única referencia de la categoría Montaje, este proyecto define hoy el estándar de esa línea de negocio.

Qué hacer con esto

1. **Usar la estructura de costos de CVAL como plantilla base para cotizar Montaje:** es la única evidencia de que el modelo de presupuesto de la empresa puede acertar por categoría, no solo en el total.
2. **Revisar si el precio de venta dejó margen sobre la mesa:** con 15% de ahorro sobre presupuesto y un ciclo de 4 días, hay espacio para evaluar si el alcance estaba sobrevalorado o si el trabajo fue excepcionalmente eficiente.
3. **Documentar qué se hizo distinto en la cotización de este proyecto** antes de que se pierda el contexto — es el único punto de comparación disponible para corregir el 55%+ de error del resto de la cartera.
