



Proyecto ESFOCAR

Generado el 24-09-2026

ESFOCAR

EN DESARROLLO

TAG ESFO

Cliente ESFOCAR

Categoría Mantenimiento

Avance 100,0%

Cierre sin fecha

96/100

Nota del Proyecto
Excelente

80,6%

Margen estimado al cierre
Objetivo 25% · mediana cartera
45,6%

-44,8%

Desviación estimada al cierre
Presupuesto \$1.745.016


\$4.950.160

Monto de Venta (sin IVA)
3,5% de la venta de la cartera


ALERTAS DE DATOS Y DE PRESUPUESTO

- Terminado con un costo real de solo 55,2 % del presupuesto: revisar si faltan facturas o Mano de Obra por registrar antes de leer su margen.
- Equipos tiene gasto real pero presupuesto 0: su desviación no se puede medir.

PRESUPUESTO VS. GASTO REAL POR CATEGORÍA

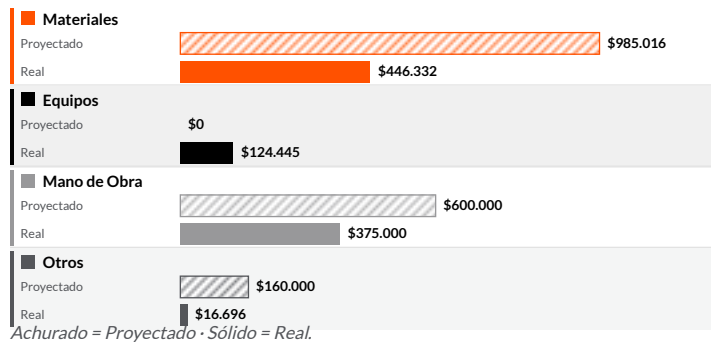

COMPOSICIÓN DEL COSTO REAL

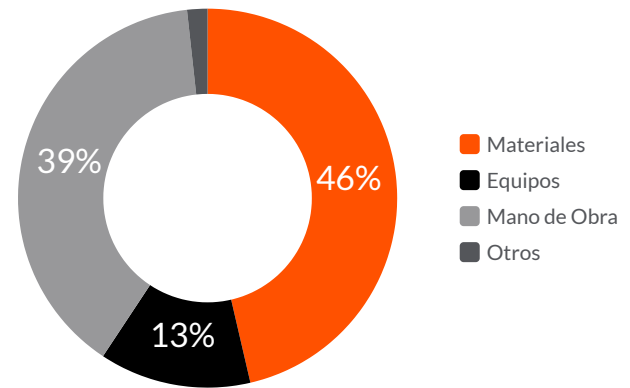

DATOS CLAVE

Concepto	Monto
Monto de Venta (sin IVA)	\$4.950.160
Costo presupuestado	\$1.745.016
Costo real a la fecha	\$962.473
Costo estimado al cierre	\$962.473
Margen estimado al cierre	\$3.987.687

INDICADORES COMPLETOS DEL PLAYBOOK

RESULTADO A LA FECHA		
Margen neto %	80,6%	Objetivo playbook: 25%
Desviación % Total	-44,8%	Ideal: cercano a 0%
Ahorro/Sobrecosto Total	\$782.543	Ideal: positivo (ahorro)
Margen por día de ejecución	—	
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA		
Desviación % Materiales	-54,7%	Ideal: cercano a 0%
Desviación % Equipos	—	Ideal: cercano a 0%
Desviación % MO	-37,5%	Ideal: cercano a 0%
Desviación % Otros	-89,6%	Ideal: cercano a 0%
Error del presupuesto %	59,1%	Ideal: cercano a 0%
Ahorro/Sobrecosto Materiales	\$538.684	Ideal: positivo (ahorro)
Ahorro/Sobrecosto Equipos	\$-124.445	Ideal: positivo (ahorro)
Ahorro/Sobrecosto MO	\$225.000	Ideal: positivo (ahorro)
Ahorro/Sobrecosto Otros	\$143.304	Ideal: positivo (ahorro)

PROYECCIÓN AL CIERRE		
Costo estimado al cierre	\$962.473	
Margen estimado al cierre	\$3.987.687	
Margen estimado al cierre %	80,6%	Objetivo playbook: 25%
Desviación estimada al cierre %	-44,8%	Sobrecosto sobre +10%
Margen al cierre % (escenario índice de costo)	80,6%	Escenario pesimista
Nota del Proyecto	96/100	Bueno ≥70 · Excelente ≥85
Evaluación	Excelente	Clasifica la Nota
ESTRUCTURA DEL COSTO REAL		
Costo Materiales % de venta	9,0%	
Costo Equipos % de venta	2,5%	
Costo MO % de venta	7,6%	
Costo Otros % de venta	0,3%	
Estructura % Materiales	46,4%	
Estructura % Equipos	12,9%	
Estructura % MO	39,0%	
Estructura % Otros	1,7%	



Análisis — Proyecto ESFOCAR (ESFO)

El proyecto marca 100% de avance y un margen de 80,6%, el más alto de la cartera, con Nota 96/100. **Esa cifra no debe leerse como resultado definitivo:** el proyecto figura sin fecha de cierre (estado en desarrollo) y consumió solo el 55,2% de su presupuesto. Una ejecución al 100% que gasta poco más de la mitad de lo previsto es, con más frecuencia, un registro de costos incompleto que una eficiencia excepcional.

Fortalezas

- Las cuatro categorías cerraron bajo presupuesto: Materiales -54,7%, Mano de Obra -37,5% y Otros -89,6%, con un ahorro agregado de \$782.543.
- Materiales a -54,7% contra un sesgo de cartera de +16,6%: **si el dato se confirma, es el mejor desempeño en materiales de toda la empresa.**
- Venta de \$4.950.160 con un costo registrado de apenas \$962.473: la relación costo/venta más baja de la cartera.

Debilidades / riesgos

- Alerta activa: terminado con un costo real de solo 55,2% del presupuesto.** Faltan por confirmar facturas o Mano de Obra antes de dar el margen por bueno — el riesgo es sobrestimar \$3.987.687 de margen.
- El proyecto no tiene fecha de cierre registrada** pese a marcar 100% de avance: mientras eso siga así, se contabiliza como "en desarrollo" y no entra en el cálculo de margen por día de ejecución.
- Equipos registra **\$124.445 de gasto real contra \$0 presupuestado:** tercera ocurrencia del mismo patrón en la cartera, y su desviación no se puede medir.
- Error del presupuesto de **59,1%:** aun asumiendo que los costos estén completos, el presupuesto no acertó ninguna categoría.

Análisis de KPIs

La Nota de 96/100 es la más alta de la cartera y está construida sobre dos componentes que aquí apuntan en la misma dirección: margen al cierre de 80,6% (muy por sobre el objetivo de 25%) y desviación de -44,8% (muy por dentro del presupuesto). El problema es que ambos se alimentan del mismo dato posiblemente incompleto — el costo real. Si aparecieran los costos faltantes hasta llegar al 100% del presupuesto, el margen caería a aproximadamente 64,7% y la Nota se ajustaría a la baja. Incluso en ese escenario el proyecto seguiría siendo el más rentable de la cartera, lo que sugiere que el resultado es genuinamente bueno pero está siendo exagerado por el registro.

Qué hacer con esto

- Cerrar el registro de costos antes de usar este proyecto como referencia comercial:** revisar facturas pendientes y confirmar la Mano de Obra efectivamente incurrida.
- Cargar la fecha de cierre real** para que el proyecto deje de figurar en desarrollo y habilite el margen por día de ejecución.
- No extrapolar el 80,6% al cotizar trabajos similares** hasta que el costo esté validado — un precio construido sobre un margen inflado no se sostiene en el segundo proyecto.
