



Proyecto UMAC

Generado el 24-09-2026

UMAG

CERRADO

TAG UMAC

Ciente Universidad de Magallanes

Categoría I+D+i

Avance 100,0%

Inicio 01-01-2026

Cierre 01-02-2026

93/100

Nota del Proyecto
Excelente

61,4%

Margen estimado al cierre
Objetivo 25% · mediana cartera
45,6%

-27,1%

Desviación estimada al cierre
Presupuesto \$7.713.765


\$14.563.245

Monto de Venta (sin IVA)
10,2% de la venta de la cartera


ALERTAS DE DATOS Y DE PRESUPUESTO

- Terminado con un costo real de solo 72,9 % del presupuesto: revisar si faltan facturas o Mano de Obra por registrar antes de leer su margen.

PRESUPUESTO VS. GASTO REAL POR CATEGORÍA

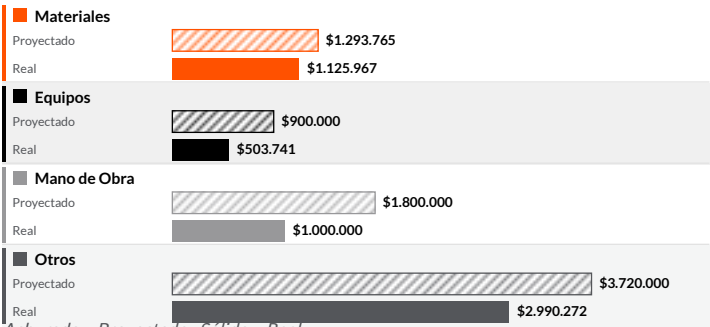

COMPOSICIÓN DEL COSTO REAL

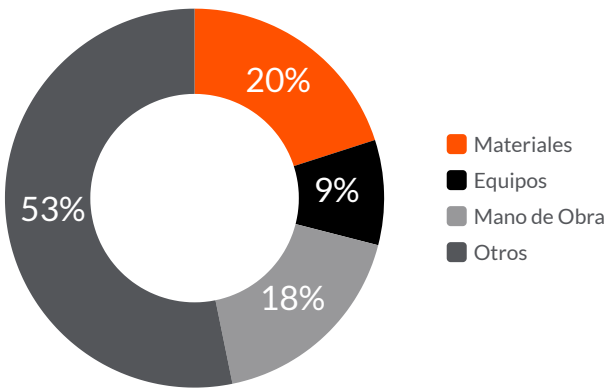

DATOS CLAVE

Concepto	Monto
Monto de Venta (sin IVA)	\$14.563.245
Costo presupuestado	\$7.713.765
Costo real a la fecha	\$5.619.980
Costo estimado al cierre	\$5.619.980
Margen estimado al cierre	\$8.943.265

INDICADORES COMPLETOS DEL PLAYBOOK

RESULTADO A LA FECHA		
Margen neto %	61,4%	Objetivo playbook: 25%
Desviación % Total	-27,1%	Ideal: cercano a 0%
Ahorro/Sobrecosto Total	\$2.093.785	Ideal: positivo (ahorro)
Margen por día de ejecución	\$288.492	
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA		
Desviación % Materiales	-13,0%	Ideal: cercano a 0%
Desviación % Equipos	-44,0%	Ideal: cercano a 0%
Desviación % MO	-44,4%	Ideal: cercano a 0%
Desviación % Otros	-19,6%	Ideal: cercano a 0%
Error del presupuesto %	27,1%	Ideal: cercano a 0%
Ahorro/Sobrecosto Materiales	\$167.798	Ideal: positivo (ahorro)
Ahorro/Sobrecosto Equipos	\$396.259	Ideal: positivo (ahorro)
Ahorro/Sobrecosto MO	\$800.000	Ideal: positivo (ahorro)
Ahorro/Sobrecosto Otros	\$729.728	Ideal: positivo (ahorro)

PROYECCIÓN AL CIERRE		
Costo estimado al cierre	\$5.619.980	
Margen estimado al cierre	\$8.943.265	
Margen estimado al cierre %	61,4%	Objetivo playbook: 25%
Desviación estimada al cierre %	-27,1%	Sobrecosto sobre +10%
Margen al cierre % (escenario índice de costo)	61,4%	Escenario pesimista
Nota del Proyecto	93/100	Bueno ≥70 · Excelente ≥85
Evaluación	Excelente	Clasifica la Nota
ESTRUCTURA DEL COSTO REAL		
Costo Materiales % de venta	7,7%	
Costo Equipos % de venta	3,5%	
Costo MO % de venta	6,9%	
Costo Otros % de venta	20,5%	
Estructura % Materiales	20,0%	
Estructura % Equipos	9,0%	
Estructura % MO	17,8%	
Estructura % Otros	53,2%	



Análisis — Proyecto UMAG

UMAG cerró con un margen de **\$8.943.265 (61,4%)**, muy por sobre el objetivo del playbook (25%) y sobre la mediana de la cartera (45,6%), con una Nota de **93/100**. La advertencia está en el denominador: el proyecto se dio por terminado habiendo gastado solo el **72,9% del presupuesto**, así que parte de ese margen puede ser costo todavía no registrado, no eficiencia.

Fortalezas

- Margen al cierre de **61,4%** — 16,8 puntos sobre la mediana de la cartera y el segundo mayor aporte de margen en pesos.
- Las 4 categorías de gasto cerraron **bajo presupuesto** (ahorro neto de \$2.093.785).
- Aporta el **10,2% de la venta** de toda la cartera con un solo proyecto.

Debilidades / riesgos

- **Costo real = 72,9% del presupuesto**: revisar facturas pendientes y, sobre todo, la Mano de Obra Real (\$1.000.000 contra \$1.800.000 presupuestados), que es un dato manual sin fuente automática.
- **Error del presupuesto 27,1%**: más de un cuarto del presupuesto quedó en la categoría equivocada, aunque el total haya dado a favor.
- Equipos **-44,0%** y Mano de Obra **-44,4%** son desviaciones grandes en contra de la tendencia de la cartera (Equipos -11,4%, MO +1,0%): acá la cotización sobrestimó, no es el patrón general de la empresa.

Análisis de KPIs

La Nota (93) está compuesta por un margen estimado al cierre muy sobre el objetivo y una desviación de -27,1% que no penaliza (el componente de control solo castiga sobrecosto). Leída sola, la Nota diría que este es el modelo a repetir; leída junto a la alerta de cobertura de costo, lo que dice es que **el resultado financiero está bien pero el registro puede estar incompleto**. El único KPI que no depende de esa duda es el *Error del presupuesto* (27,1%): mide la cotización, no la ejecución, y ahí sí hay algo que corregir — Materiales se quedó corto en la cartera (+16,6% de sesgo) mientras acá sobró 13,0%.

Qué hacer con esto

1. **Antes de usar UMAG como caso de referencia comercial**, cerrar la Mano de Obra Real y confirmar que no falten facturas: el margen que se cite depende de eso.
2. **Al cotizar I+D+i de este porte**, corregir el reparto entre categorías antes que el total: el presupuesto global fue conservador, pero Equipos y Mano de Obra se sobrestimaron casi al doble.
