



Reporte de Categoría – Mantenimiento

Generado el 20-08-2026

Categoría Mantenimiento – Panel de verificación

23,3%

Margen neto % (agregado)

\$12.099.873

Venta total (sin IVA)

2

Nº de proyectos


\$-253.739

Ahorro/Sobrecosto Total


DATOS CLAVE

Concepto	Monto
Venta total (sin IVA)	\$12.099.873
Costos Totales Real	\$9.282.217
Margen Real	\$2.817.656
Desviación % Total	2,8%

COMPOSICIÓN DE COSTOS REALES

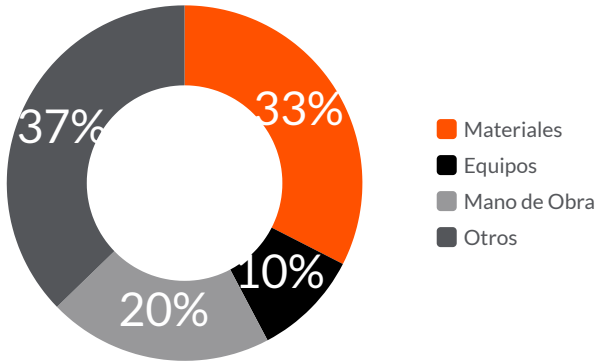

COSTOS PROYECTADOS VS. REALES POR CATEGORÍA DE GASTO

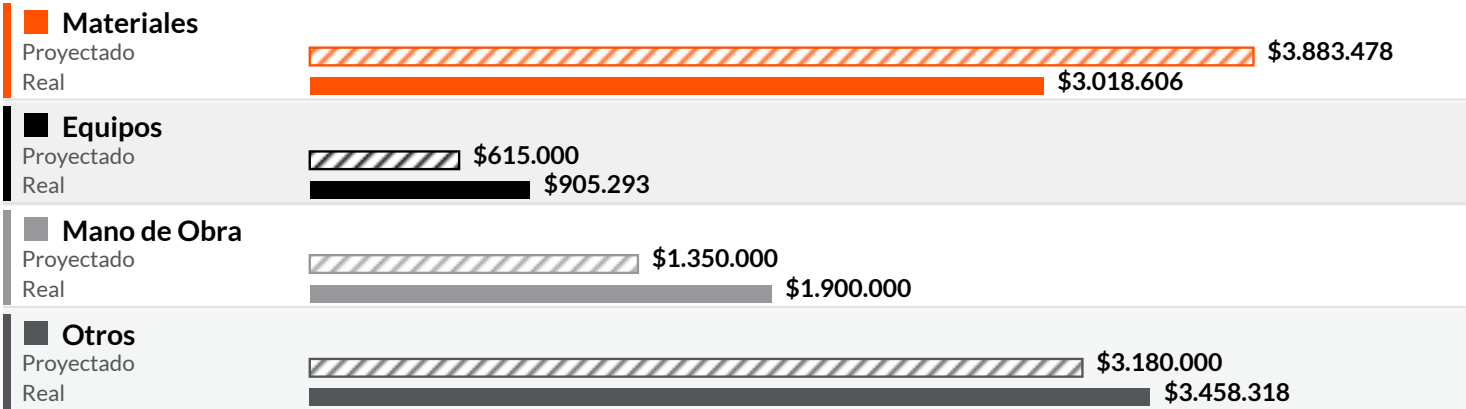

INDICADORES COMPLETOS (AGREGADO DE 2 PROYECTOS: CCON, CREM) – NARANJO/NEGRITA = KPI FUERA DE RANGO

KPI	Valor	Referencia
Margen neto %	23,3%	Objetivo playbook: 25%
Costo Materiales % de venta	24,9%	
Costo Equipos % de venta	7,5%	
Costo MO % de venta	15,7%	
Costo Otros % de venta	28,6%	
Estructura % Materiales	32,5%	
Estructura % Equipos	9,8%	
Estructura % MO	20,5%	
Estructura % Otros	37,3%	
Desviación % Materiales	-22,3%	Ideal: cercano a 0%
Desviación % Equipos	47,2%	Ideal: cercano a 0%
Desviación % MO	40,7%	Ideal: cercano a 0%
Desviación % Otros	8,8%	Ideal: cercano a 0%
Desviación % Total	2,8%	Ideal: cercano a 0%
Ahorro/Sobrecosto Materiales	\$864.872	Ideal: positivo (ahorro)
Ahorro/Sobrecosto Equipos	\$-290.293	Ideal: positivo (ahorro)
Ahorro/Sobrecosto MO	\$-550.000	Ideal: positivo (ahorro)
Ahorro/Sobrecosto Otros	\$-278.318	Ideal: positivo (ahorro)
Ahorro/Sobrecosto Total	\$-253.739	Ideal: positivo (ahorro)



Análisis — Categoría Mantenimiento

La categoría Mantenimiento agrupa hoy **2 proyectos con datos completos** (CCON y CREM), con una venta conjunta de **\$12.099.873** y un margen neto agregado de **23,3%**, levemente por debajo del objetivo del playbook (25%). A diferencia de I+D+i, aquí los costos reales quedaron levemente **por sobre** lo proyectado en el agregado (2,8%), con sobrecostos marcados en Equipos y Mano de Obra que un ahorro en Materiales solo compensa parcialmente.

Fortalezas

- Margen neto agregado de **23,3%** (\$2.817.656 sobre \$12.099.873 de venta) — cercano al objetivo del playbook (25%), aunque por debajo.
- Ahorro en Materiales de **\$864.872** (desviación -22,3%) en los 2 proyectos — la única categoría de gasto con ahorro consistente en ambos.
- CCON individualmente queda en zona "Bueno" (Nota 81/100) pese al sobrecosto en Equipos; CREM en "Aprobado" (Nota 66/100) — ningún proyecto de la categoría cae en zona de alerta baja.

Debilidades / riesgos

- Sobrecosto marcado en **Equipos** (desviación 47,2%, \$290.293 sobre lo proyectado) y en **Mano de Obra** (desviación 40,7%, \$550.000 sobre lo proyectado) — ambos marcados en naranja en la tabla de indicadores.
- Inconsistencia detectada en los datos fuente de **CCON**: el campo "Estado" dice "En Proceso", pero su "Fecha de cierre" (29-06-2026) ya pasó al momento de generar este reporte (20-08-2026) — el sistema lo trata como cerrado (no "en desarrollo") solo por la fecha; vale la pena confirmar manualmente si el proyecto realmente sigue abierto o si el campo "Estado" quedó desactualizado.
- Solo **2 proyectos** componen la categoría hoy — un tercer cierre cambiaría el promedio agregado de forma significativa, como ya ocurrió con CVAL (reclasificado de "Mantenimiento" a "Montaje" durante la elaboración de este mismo reporte).

Análisis de KPIs

El margen neto agregado (23,3%) esconde una brecha real entre los dos proyectos: CCON cerró con margen neto de 27,99% (por sobre el objetivo) mientras CREM cerró con 19,26% (por debajo) — el promedio agregado no debe leerse como "el margen típico de Mantenimiento" sin mirar la dispersión. La "Estructura % Otros" (37,3% de los costos reales) está fuertemente influida por el costo real de "Otros" de CREM, muy superior a su propio proyectado (desviación +55,7%) — antes de usar este mix como referencia para futuras cotizaciones de Mantenimiento, revisar el desglose de "Detalle Costos Reales" de CREM para entender qué ítems concretos componen ese sobrecosto.

Notas estratégicas

1. Confirmar con el responsable del proyecto si CCON sigue realmente "En Proceso" o si corresponde actualizar su "Estado" a "Terminado" dado que su fecha de cierre ya pasó — mientras no se resuelva, tratar el margen y la desviación de CCON como preliminares.
2. Revisar el proceso de cotización de Equipos y Mano de Obra para proyectos de Mantenimiento: ambas categorías de gasto muestran sobrecosto en más de un proyecto de la muestra.
3. Re-generar este reporte si el "Estado"/"Categoría" de algún proyecto cambia de nuevo — los datos de este módulo se editan a mano en paralelo y ya se detectó un cambio de categoría (CVAL) y un ajuste de costo real (CREM, "Otros") durante esta misma sesión de trabajo.
