



Reporte de Cliente – Cesfam Constitución

Generado el 20-08-2026

Cliente Cesfam Constitución – Panel de verificación

\$1.562.168

CLTV

28,0%

Margen de utilidad %

Cientes de oportunidad

Clasificación


1 proyecto(s)

Vida del cliente


DATOS CLAVE (CLTV)

Concepto	Monto
AOV (Valor promedio de venta)	\$5.581.223
Frecuencia de compra (proyectos/año)	1,0
Margen de utilidad %	28,0%
CLTV	\$1.562.168

COMPOSICIÓN DE COSTOS REALES

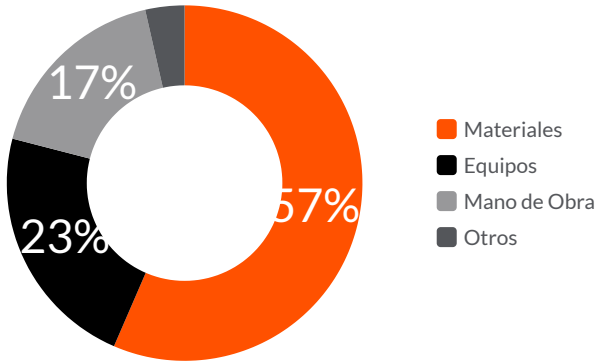

COSTOS PROYECTADOS VS. REALES POR CATEGORÍA DE GASTO

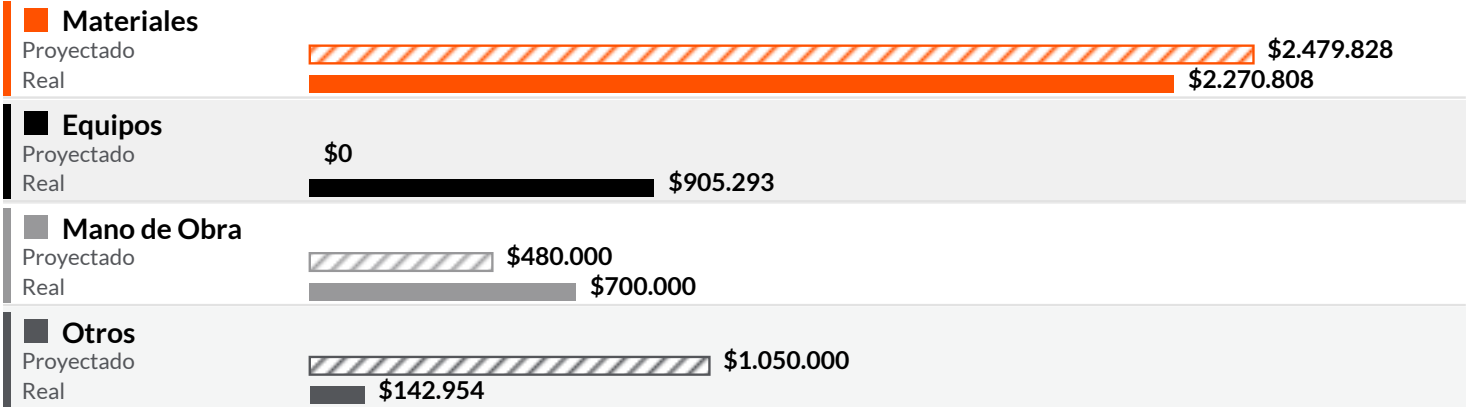

INDICADORES COMPLETOS (AGREGADO DE 1 PROYECTO(S) DEL CLIENTE: CCON) – NARANJO/NEGRITA = KPI FUERA DE RANGO

KPI	Valor	Referencia
Margen neto %	28,0%	Objetivo playbook: 25%
Costo Materiales % de venta	40,7%	
Costo Equipos % de venta	16,2%	
Costo MO % de venta	12,5%	
Costo Otros % de venta	2,6%	
Estructura % Materiales	56,5%	
Estructura % Equipos	22,5%	
Estructura % MO	17,4%	
Estructura % Otros	3,6%	
Desviación % Materiales	-8,4%	Ideal: cercano a 0%
Desviación % Equipos	N/D	Ideal: cercano a 0%
Desviación % MO	45,8%	Ideal: cercano a 0%
Desviación % Otros	-86,4%	Ideal: cercano a 0%
Desviación % Total	0,2%	Ideal: cercano a 0%
Ahorro/Sobrecosto Materiales	\$209.020	Ideal: positivo (ahorro)
Ahorro/Sobrecosto Equipos	\$-905.293	Ideal: positivo (ahorro)
Ahorro/Sobrecosto MO	\$-220.000	Ideal: positivo (ahorro)
Ahorro/Sobrecosto Otros	\$907.046	Ideal: positivo (ahorro)
Ahorro/Sobrecosto Total	\$-9.227	Ideal: positivo (ahorro)



Análisis — Cliente Cesfam Constitución

Cesfam Constitución es, hasta ahora, un cliente con un **único proyecto** (CCON), que dejó un CLTV de **\$1.562.168** y una clasificación de "Clientes de oportunidad" — el nivel más bajo de la escala actual, pese a un margen de utilidad de **28,0%**, por sobre el objetivo del playbook (25%). El CLTV relativamente bajo se explica por un AOV más chico que el de otros clientes de la cartera, no por un mal resultado del proyecto en sí.

Fortalezas

- Margen de utilidad de **28,0%** en su único proyecto, por sobre el objetivo del playbook (25%).
- Ahorro en Materiales (\$209.020) y en Otros (\$907.046) — las dos categorías de gasto con mayor peso presupuestado quedaron por debajo de lo proyectado.
- Nota del Proyecto 81/100 ("Bueno") pese al sobrecosto en Equipos que se detalla abajo.

Debilidades / riesgos

- Costos Equipos Reales de **\$905.293** (16,2% de la venta) sin ningún presupuesto asignado en la cotización original (Costos Equipos Proyectados = \$0) — la "Desviación % Equipos" queda indefinida (N/D) por división entre cero, no porque falte el dato: hubo gasto real en una categoría que la cotización no contempló.
- Sobrecosto en Mano de Obra (desviación 45,8%, \$220.000 sobre lo proyectado) — el ahorro en Materiales y Otros lo compensa casi por completo, dejando un Ahorro/Sobrecosto Total prácticamente neutro (\$-9.227).
- Inconsistencia en los datos fuente: el campo "Estado" del proyecto CCON dice "En Proceso", pero su "Fecha de cierre" (29-06-2026) ya pasó al momento de generar este reporte (20-08-2026) — confirmar manualmente si el proyecto sigue realmente abierto.
- Un solo proyecto registrado: CLTV, margen y clasificación descansan en un solo dato.

Análisis de KPIs

El CLTV de \$1.562.168 y la clasificación "Clientes de oportunidad" no reflejan un mal desempeño del proyecto — el margen de utilidad (28,0%) está por sobre el objetivo del playbook. La clasificación es relativa al AOV: con \$5.581.223 de venta, este es el segundo ticket más bajo entre los 5 clientes con proyecto cerrado evaluados en esta ronda de reportes, lo que pesa más que el margen a la hora de calcular CLTV ($AOV \times Frecuencia \times Vida \times Margen\%$). El gasto real en Equipos (\$905.293, no presupuestado) es la señal más concreta a revisar: o el alcance del proyecto cambió durante la ejecución, o la cotización original omitió una partida de equipos que sí fue necesaria.

Notas estratégicas

1. Confirmar con el responsable si CCON sigue "En Proceso" o si su "Estado" debe actualizarse a "Terminado" dado que la fecha de cierre ya pasó.
2. Investigar por qué la cotización de CCON no incluyó presupuesto de Equipos pese a un gasto real de \$905.293 — revisar si fue un cambio de alcance o un vacío en el proceso de cotización, para no repetirlo con clientes similares.
3. Revisar esta ficha cuando Cesfam Constitución cierre un segundo proyecto — recién ahí el CLTV deja de depender de un solo dato.
