



Reporte de Cliente – Cremación Concepción

Generado el 20-08-2026

Cliente Cremación Concepción – Panel de verificación

\$1.255.488

CLTV

19,3%

Margen de utilidad %

Cientes de oportunidad

Clasificación


1 proyecto(s)

Vida del cliente


DATOS CLAVE (CLTV)

Concepto	Monto
AOV (Valor promedio de venta)	\$6.518.650
Frecuencia de compra (proyectos/año)	1,0
Margen de utilidad %	19,3%
CLTV	\$1.255.488

COMPOSICIÓN DE COSTOS REALES

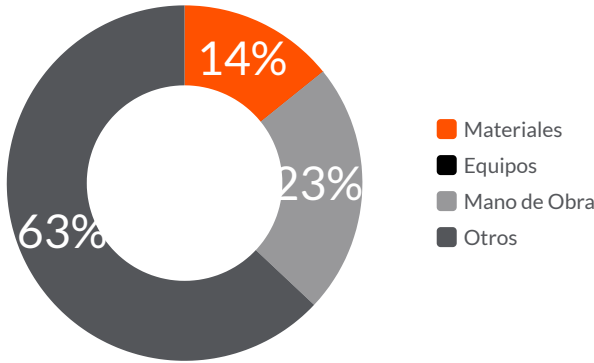

COSTOS PROYECTADOS VS. REALES POR CATEGORÍA DE GASTO

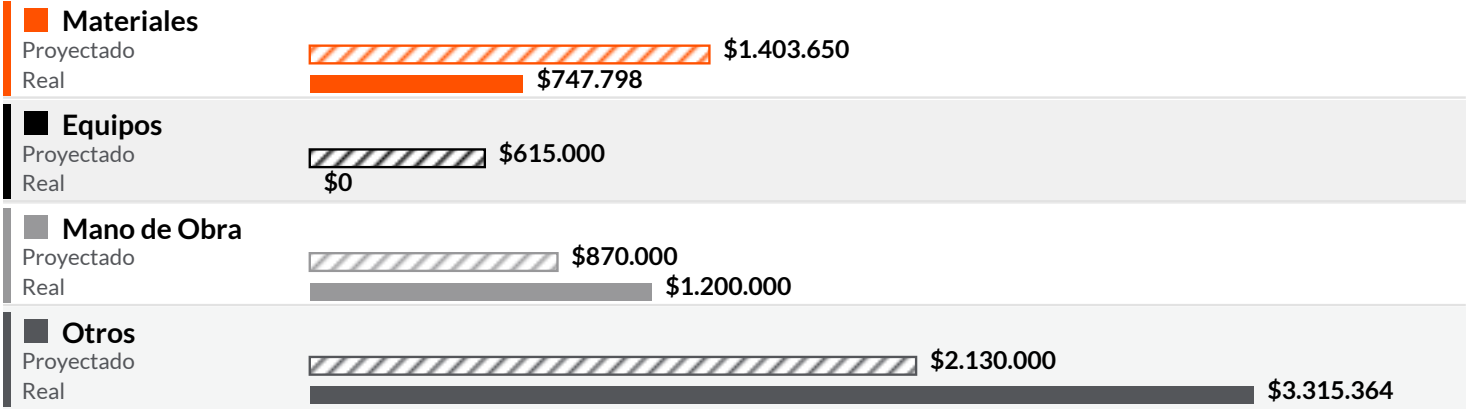

INDICADORES COMPLETOS (AGREGADO DE 1 PROYECTO(S) DEL CLIENTE: CREM) – NARANJO/NEGRITA = KPI FUERA DE RANGO

KPI	Valor	Referencia
Margen neto %	19,3%	Objetivo playbook: 25%
Costo Materiales % de venta	11,5%	
Costo Equipos % de venta	0,0%	
Costo MO % de venta	18,4%	
Costo Otros % de venta	50,9%	
Estructura % Materiales	14,2%	
Estructura % Equipos	0,0%	
Estructura % MO	22,8%	
Estructura % Otros	63,0%	
Desviación % Materiales	-46,7%	Ideal: cercano a 0%
Desviación % Equipos	-100,0%	Ideal: cercano a 0%
Desviación % MO	37,9%	Ideal: cercano a 0%
Desviación % Otros	55,7%	Ideal: cercano a 0%
Desviación % Total	4,9%	Ideal: cercano a 0%
Ahorro/Sobrecosto Materiales	\$655.852	Ideal: positivo (ahorro)
Ahorro/Sobrecosto Equipos	\$615.000	Ideal: positivo (ahorro)
Ahorro/Sobrecosto MO	\$-330.000	Ideal: positivo (ahorro)
Ahorro/Sobrecosto Otros	\$-1.185.364	Ideal: positivo (ahorro)
Ahorro/Sobrecosto Total	\$-244.512	Ideal: positivo (ahorro)



Análisis — Cliente Cremación Concepción

Cremación Concepción es, hasta ahora, un cliente con un **único proyecto** (CREM), que dejó un CLTV de **\$1.255.488** y una clasificación de "Clientes de oportunidad". El margen de utilidad de ese proyecto es de **19,3%, por debajo** del objetivo del playbook (25%) — el resultado está dominado por un fuerte sobrecosto en "Otros" (55,7% sobre lo proyectado, \$1.185.364 de sobrecosto), que un ahorro en Materiales y Equipos no alcanza a compensar.

Fortalezas

- Ahorro en Materiales de **\$655.852** (desviación -46,7%) y ahorro total en Equipos de **\$615.000** (no hubo gasto real en esa categoría, \$615.000 presupuestados).
- Nota del Proyecto 66/100 ("Aprobado") — pasa el umbral aprobatorio del playbook (≥ 55) pese al sobrecosto marcado en "Otros".
- AOV (venta promedio) de **\$6.518.650** — el segundo ticket más alto entre los 5 clientes evaluados en esta ronda.

Debilidades / riesgos

- Sobrecosto marcado en "Otros": **\$3.315.364** real vs. **\$2.130.000** proyectado (desviación 55,7%, \$1.185.364 sobre lo proyectado) — es, por lejos, el principal factor que empuja el margen del proyecto por debajo del objetivo del playbook.
- Margen de utilidad de **19,3%**, por debajo del objetivo del playbook (25%) — a diferencia de los otros 4 clientes evaluados en esta ronda de reportes, que cerraron todos por sobre el objetivo.
- Sobrecosto también en Mano de Obra (desviación 37,9%, \$330.000 sobre lo proyectado).
- Nota de trazabilidad: el costo real "Otros" de este proyecto cambió de forma significativa durante la elaboración de esta misma ronda de reportes (de un valor bajo a los \$3.315.364 actuales) — si se compara este reporte contra una versión anterior del análisis de Cremación Concepción, la diferencia refleja una actualización real de los datos fuente en Centro de Costos, no un error de cálculo.
- Un solo proyecto registrado: CLTV, margen y clasificación descansan en un solo dato.

Análisis de KPIs

"Estructura % Otros" (63,0% de los costos reales) es, con diferencia, el KPI más atípico de este proyecto — más de la mitad del costo real total quedó concentrado en una sola categoría de gasto, cuando lo proyectado la ponía en un rol relevante pero no dominante (42,4% del total proyectado). Antes de tomar cualquier decisión comercial sobre este cliente basada en el margen actual, revisar el desglose de "Detalle Costos Reales" del proyecto CREM para identificar qué ítems concretos componen ese sobrecosto en "Otros" — sin ese detalle, no es posible distinguir entre un problema de ejecución, un cambio de alcance, o un error de registro en Centro de Costos.

Notas estratégicas

- Priorizar la revisión del detalle de "Otros Costos Reales" de CREM en Centro de Costos antes de cerrar cualquier evaluación comercial de Cremación Concepción — el sobrecosto de \$1.185.364 en esa categoría es el hallazgo más relevante de este reporte.
- No usar el margen actual de este cliente (19,3%) como referencia de cotización para clientes similares sin antes confirmar si el sobrecosto en "Otros" es estructural (se repetirá) o puntual (un evento único de este proyecto).
- Revisar esta ficha cuando Cremación Concepción cierre un segundo proyecto — recién ahí el CLTV deja de depender de un solo dato.
