



Proyecto CCON – Cesfam Constitución – Panel de verificación

81/100

Nota del Proyecto

28,0%

Margen neto %

0,2%

Desviación % Total


Bueno

Evaluación


DATOS CLAVE

| Concepto                 | Monto       |
|--------------------------|-------------|
| Monto de Venta (sin IVA) | \$5.581.223 |
| Total Real               | \$4.019.055 |
| Margen Real              | \$1.562.168 |

COMPOSICIÓN DE COSTOS REALES

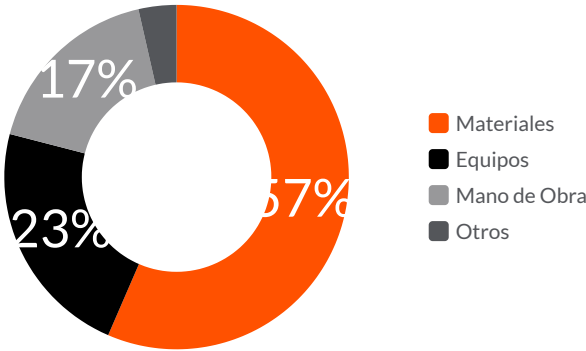

COSTOS PROYECTADOS VS. REALES POR CATEGORÍA DE GASTO

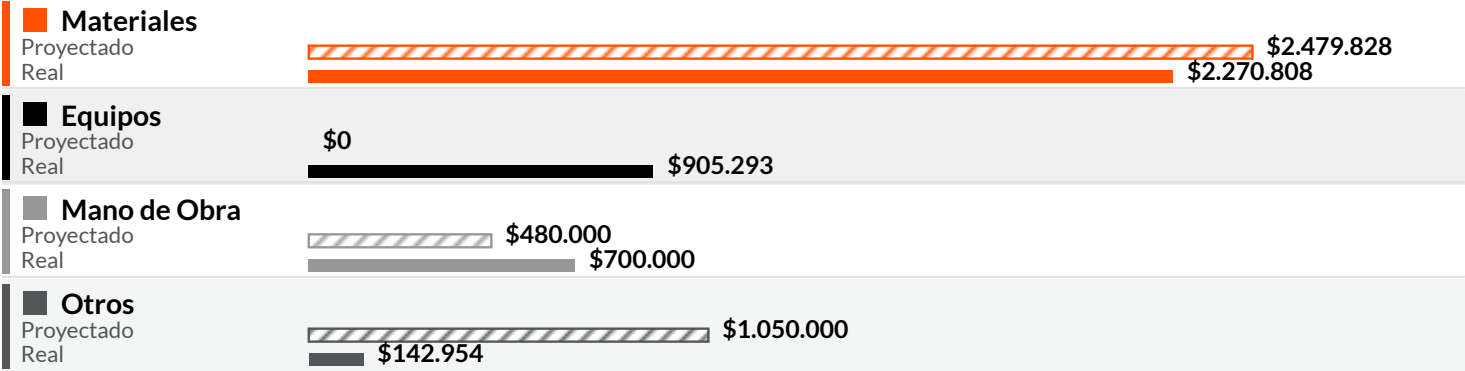

INDICADORES COMPLETOS – PROYECTO CCON – NARANJO/NEGRITA = KPI FUERA DE RANGO

| KPI                          | Valor      | Referencia               |
|------------------------------|------------|--------------------------|
| Margen neto %                | 28,0%      | Objetivo playbook: 25%   |
| Costo Materiales % de venta  | 40,7%      |                          |
| Costo Equipos % de venta     | 16,2%      |                          |
| Costo MO % de venta          | 12,5%      |                          |
| Costo Otros % de venta       | 2,6%       |                          |
| Estructura % Materiales      | 56,5%      |                          |
| Estructura % Equipos         | 22,5%      |                          |
| Estructura % MO              | 17,4%      |                          |
| Estructura % Otros           | 3,6%       |                          |
| Desviación % Materiales      | -8,4%      | Ideal: cercano a 0%      |
| Desviación % Equipos         | N/D        | Ideal: cercano a 0%      |
| Desviación % MO              | 45,8%      | Ideal: cercano a 0%      |
| Desviación % Otros           | -86,4%     | Ideal: cercano a 0%      |
| Desviación % Total           | 0,2%       | Ideal: cercano a 0%      |
| Ahorro/Sobrecosto Materiales | \$209.020  | Ideal: positivo (ahorro) |
| Ahorro/Sobrecosto Equipos    | \$-905.293 | Ideal: positivo (ahorro) |
| Ahorro/Sobrecosto MO         | \$-220.000 | Ideal: positivo (ahorro) |
| Ahorro/Sobrecosto Otros      | \$907.046  | Ideal: positivo (ahorro) |
| Ahorro/Sobrecosto Total      | \$-9.227   | Ideal: positivo (ahorro) |
| Nota del Proyecto            | 81/100     |                          |



## Análisis — Proyecto CCON

El proyecto CCON (Cesfam Constitución, cliente Cesfam Constitución) cerró con un margen neto de **28,0%**, por sobre el objetivo del playbook (25%), y una desviación total de costos reales de **0,2%** respecto de lo proyectado — prácticamente en línea con el presupuesto en el agregado, aunque con diferencias marcadas categoría por categoría. Nota del Proyecto: **81/100 ("Bueno")**.

### Fortalezas

- Margen neto de **28,0%** (\$1.562.168 sobre \$5.581.223 de venta), por sobre el objetivo del playbook (25%).
- Ahorro en Materiales (\$209.020) y en Otros (\$907.046) — las dos categorías de mayor presupuesto quedaron por debajo de lo proyectado.
- Nota del Proyecto 81/100 ("Bueno").

### Debilidades / riesgos

- Costos Equipos Reales de **\$905.293** (16,2% de la venta) sin presupuesto asignado en la cotización original (Costos Equipos Proyectados = \$0) — la "Desviación % Equipos" queda indefinida (N/D) por división entre cero.
- Sobrecosto en Mano de Obra (desviación 45,8%, \$220.000 sobre lo proyectado) — junto con Equipos, deja el Ahorro/Sobrecosto Total prácticamente neutro (\$-9.227) pese al fuerte ahorro en las otras dos categorías.
- **Inconsistencia detectada en los datos fuente:** el campo "Estado" de este proyecto dice "En Proceso", pero su "Fecha de cierre" (29-06-2026) ya pasó al momento de generar este reporte (20-08-2026) — el sistema no lo trata como "en desarrollo" solo por esa fecha, pero vale la pena confirmar manualmente si el proyecto sigue realmente abierto o si el campo "Estado" quedó desactualizado.

### Análisis de KPIs

La "Desviación % Total" cercana a 0% esconde compensaciones internas: Materiales y Otros muy por debajo de lo proyectado, Equipos y Mano de Obra por sobre — no es un proyecto "sin sorpresas", es un proyecto con dos sorpresas que casi se cancelan en el agregado. El gasto real en Equipos (\$905.293, no presupuestado) es la señal más concreta a revisar: o el alcance del proyecto cambió durante la ejecución, o la cotización original omitió una partida de equipos que sí fue necesaria.

### Notas de cierre

1. Confirmar con el responsable del proyecto si CCON sigue "En Proceso" o si su "Estado" debe actualizarse a "Terminado" dado que la fecha de cierre ya pasó.
2. Investigar por qué la cotización de CCON no incluyó presupuesto de Equipos pese a un gasto real de \$905.293 — revisar si fue un cambio de alcance o un vacío en el proceso de cotización.
3. Revisar el proceso de cotización de Mano de Obra para proyectos de Mantenimiento similares — el sobrecosto de 45,8% en esta categoría también aparece en otros proyectos del mismo tipo (ver reporte de categoría Mantenimiento).
