



Proyecto CVAL – Caldera Valdivia – Panel de verificación

87/100

Nota del Proyecto

39,6%

Margen neto %

-15,0%

Desviación % Total


Excelente

Evaluación


DATOS CLAVE

Concepto	Monto
Monto de Venta (sin IVA)	\$6.020.169
Total Real	\$3.635.313
Margen Real	\$2.384.856

COMPOSICIÓN DE COSTOS REALES

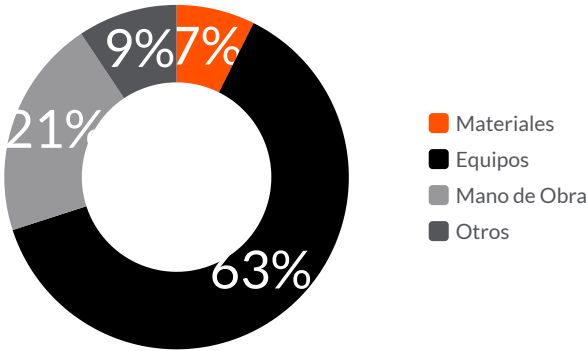

COSTOS PROYECTADOS VS. REALES POR CATEGORÍA DE GASTO

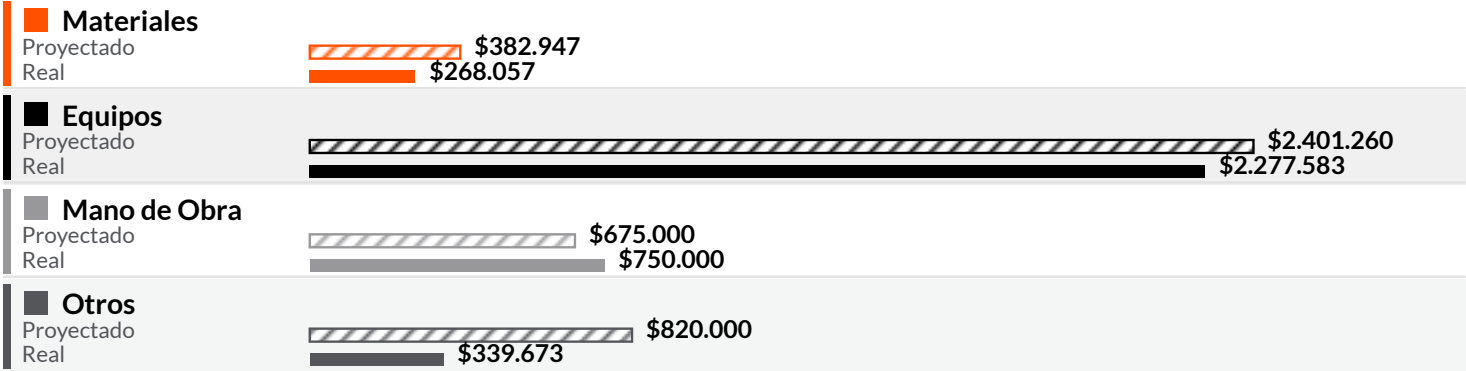

INDICADORES COMPLETOS – PROYECTO CVAL – NARANJO/NEGRITA = KPI FUERA DE RANGO

KPI	Valor	Referencia
Margen neto %	39,6%	Objetivo playbook: 25%
Costo Materiales % de venta	4,5%	
Costo Equipos % de venta	37,8%	
Costo MO % de venta	12,5%	
Costo Otros % de venta	5,6%	
Estructura % Materiales	7,4%	
Estructura % Equipos	62,7%	
Estructura % MO	20,6%	
Estructura % Otros	9,3%	
Desviación % Materiales	-30,0%	Ideal: cercano a 0%
Desviación % Equipos	-5,2%	Ideal: cercano a 0%
Desviación % MO	11,1%	Ideal: cercano a 0%
Desviación % Otros	-58,6%	Ideal: cercano a 0%
Desviación % Total	-15,0%	Ideal: cercano a 0%
Ahorro/Sobrecosto Materiales	\$114.890	Ideal: positivo (ahorro)
Ahorro/Sobrecosto Equipos	\$123.677	Ideal: positivo (ahorro)
Ahorro/Sobrecosto MO	\$-75.000	Ideal: positivo (ahorro)
Ahorro/Sobrecosto Otros	\$480.327	Ideal: positivo (ahorro)
Ahorro/Sobrecosto Total	\$643.894	Ideal: positivo (ahorro)
Nota del Proyecto	87/100	



Análisis — Proyecto CVAL

El proyecto CVAL (Caldera Valdivia, cliente Caldera Valdivia, categoría "Montaje") cerró con un margen neto de **39,6%**, muy por sobre el objetivo del playbook (25%), y una desviación total de costos reales de **-15,0%** (costos por debajo de lo proyectado). Nota del Proyecto: **87/100** ("Excelente").

Fortalezas

- Margen neto de **39,6%** (\$2.384.856 sobre \$6.020.169 de venta), muy por sobre el objetivo del playbook (25%).
- Ahorro en las 3 categorías con mayor peso presupuestado: Materiales (\$114.890), Equipos (\$123.677) y Otros (\$480.327).
- La cotización de Equipos (el componente que más pesa en este proyecto, 62,7% de los costos reales) estuvo bien calibrada: desviación de solo -5,2%.
- Nota del Proyecto 87/100 ("Excelente").

Debilidades / riesgos

- Sobrecosto leve en Mano de Obra (desviación 11,1%, \$75.000 sobre lo proyectado) — la única categoría de gasto sin ahorro en este proyecto.
- El proyecto fue reclasificado de categoría "Mantenimiento" a "Montaje" en el Excel durante la elaboración de esta ronda de reportes — ya no se agrupa con CCON/CREM en el reporte de categoría "Mantenimiento"; queda como único proyecto con datos completos de la nueva categoría "Montaje" (sin reporte propio todavía, no fue parte de esta ronda).

Análisis de KPIs

A diferencia de los proyectos de la categoría I+D+i (UMAG, MLER), donde las 4 categorías de gasto quedaron muy por debajo de lo proyectado, aquí solo Materiales (-30,0%) y Otros (-58,6%) muestran una brecha grande — Equipos, el componente dominante del proyecto, estuvo bien cotizado. Esto sugiere que el patrón de sobreestimación de costos detectado en I+D+i no se repite igual en Montaje, al menos con esta única muestra.

Notas de cierre

1. Usar la cotización de Equipos de este proyecto (desviación de solo -5,2%) como referencia de buena práctica al cotizar futuros proyectos de Montaje.
2. Revisar el sobrecosto de Mano de Obra (11,1%) — patrón que también aparece en proyectos de Mantenimiento (ver reporte de esa categoría), podría ser un problema transversal de estimación de horas/tarifas, no específico de este proyecto.
3. Generar un reporte de categoría "Montaje" cuando haya al menos un segundo proyecto completo en esa categoría — hoy CVAL es el único con datos completos.
