



Proyecto UMAC – UMAC – Panel de verificación

93/100

Nota del Proyecto

61,4%

Margen neto %

-27,1%

Desviación % Total


Excelente

Evaluación


DATOS CLAVE

Concepto	Monto
Monto de Venta (sin IVA)	\$14.563.245
Total Real	\$5.619.980
Margen Real	\$8.943.265

COMPOSICIÓN DE COSTOS REALES

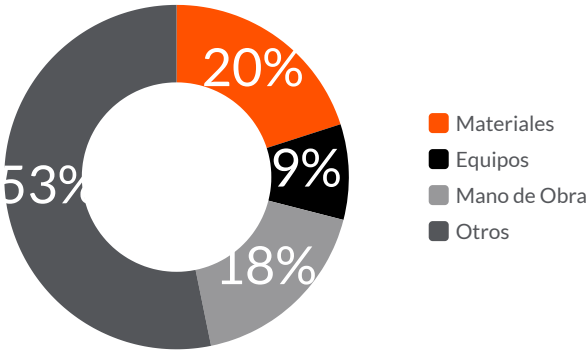

COSTOS PROYECTADOS VS. REALES POR CATEGORÍA DE GASTO

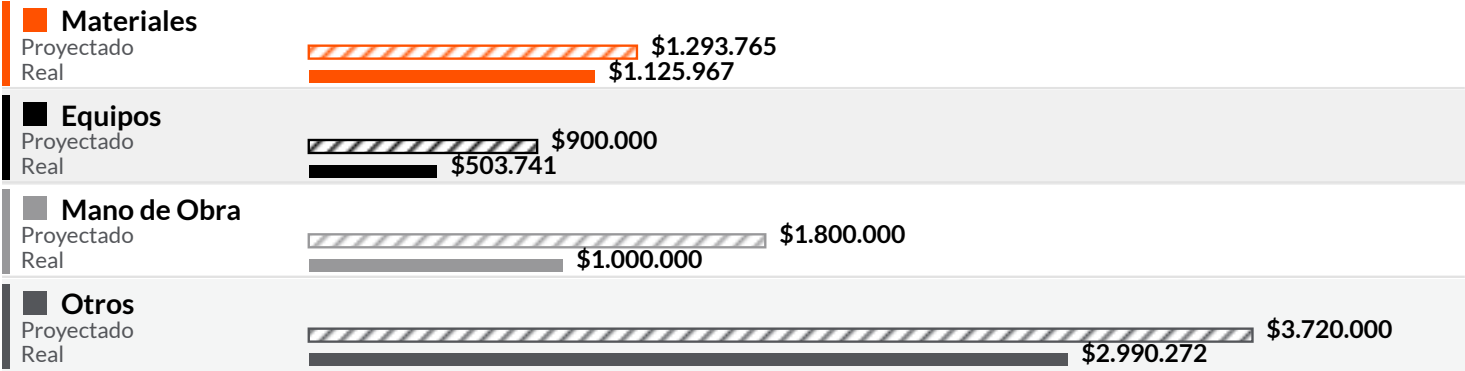

INDICADORES COMPLETOS – PROYECTO UMAC – NARANJO/NEGRITA = KPI FUERA DE RANGO

KPI	Valor	Referencia
Margen neto %	61,4%	Objetivo playbook: 25%
Costo Materiales % de venta	7,7%	
Costo Equipos % de venta	3,5%	
Costo MO % de venta	6,9%	
Costo Otros % de venta	20,5%	
Estructura % Materiales	20,0%	
Estructura % Equipos	9,0%	
Estructura % MO	17,8%	
Estructura % Otros	53,2%	
Desviación % Materiales	-13,0%	Ideal: cercano a 0%
Desviación % Equipos	-44,0%	Ideal: cercano a 0%
Desviación % MO	-44,4%	Ideal: cercano a 0%
Desviación % Otros	-19,6%	Ideal: cercano a 0%
Desviación % Total	-27,1%	Ideal: cercano a 0%
Ahorro/Sobrecosto Materiales	\$167.798	Ideal: positivo (ahorro)
Ahorro/Sobrecosto Equipos	\$396.259	Ideal: positivo (ahorro)
Ahorro/Sobrecosto MO	\$800.000	Ideal: positivo (ahorro)
Ahorro/Sobrecosto Otros	\$729.728	Ideal: positivo (ahorro)
Ahorro/Sobrecosto Total	\$2.093.785	Ideal: positivo (ahorro)
Nota del Proyecto	93/100	



Análisis – Proyecto UMAC

El proyecto UMAC (UMAG, cliente Universidad de Magallanes, categoría "I+D+i") es, hasta ahora, el **proyecto de mayor venta** de la cartera con datos completos (\$14.563.245). Cerró con un margen neto de **61,4%**, muy por sobre el objetivo del playbook (25%), y costos reales por debajo de lo proyectado en las 4 categorías de gasto (desviación total -27,1%). Nota del Proyecto: **93/100** ("Excelente").

Fortalezas

- Mayor venta de la cartera con datos completos: **\$14.563.245** — más del doble del segundo proyecto más grande.
- Margen neto de **61,4%** (\$8.943.265 sobre venta), con ahorro consistente en las 4 categorías de gasto (Ahorro/Sobrecosto Total de \$2.093.785).
- Nota del Proyecto 93/100 ("Excelente").

Debilidades / riesgos

- Desviaciones marcadas en Equipos (-44,0%) y Mano de Obra (-44,4%) — ambas por debajo de lo proyectado en más de 40%, lo que sugiere una cotización sistemáticamente conservadora para este segmento, no solo buena ejecución.
- "Otros" concentra **53,2%** de los costos reales del proyecto — el componente individual más grande en pesos (\$2.990.272), pese a también quedar 19,6% bajo lo proyectado.

Análisis de KPIs

Con \$14.563.245 de venta, este es el proyecto de mayor tamaño de toda la cartera evaluada en esta ronda — más del doble del segundo proyecto más grande (Cremación Concepción). Las 4 categorías de gasto quedaron por debajo de lo proyectado (entre 13,0% y 44,4%), el mismo patrón que el resto de la categoría I+D+i (ver también el reporte de MLER) — reforzando la hipótesis de que el método de cotización de esta categoría sobreestima costos de forma sistemática.

Notas de cierre

1. Aplicar la revisión del método de cotización de I+D+i (ver reporte de esa categoría) especialmente a proyectos de este porte — la brecha en pesos entre proyectado y real de este proyecto es la mayor de toda la cartera evaluada en esta ronda.
2. Usar este proyecto como caso de referencia comercial (alto margen, bajo costo real) al cotizar clientes similares del segmento I+D+i, con la misma cautela sobre sobreestimación de costos.
