



Categoría I+D+i

Generado el 24-09-2026

I+D+i

Proyectos completos 2 Clientes Microturbina LER, Universidad de Magallanes

\$19.888.570

Venta de la categoría
13,9% de la venta de la cartera

\$11.693.413

Margen acumulado (al cierre)


58,8%

Margen % ponderado
Objetivo 25%


88/100

Nota promedio
2 proyecto(s) · 2 cliente(s)

PRESUPUESTO VS. GASTO REAL POR CATEGORÍA

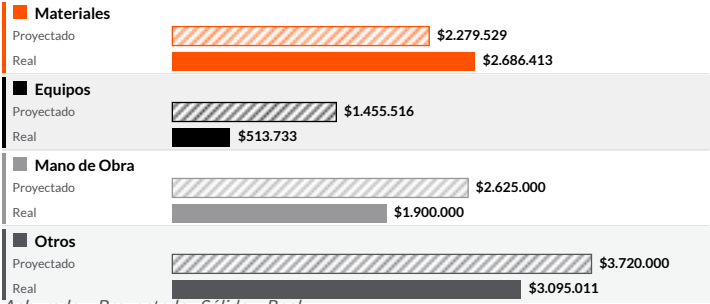

COMPOSICIÓN DEL COSTO REAL

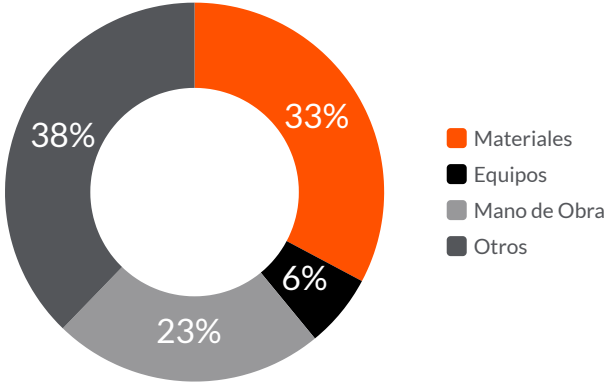

PROYECTOS CONSIDERADOS (SOLO LOS DE DATOS COMPLETOS)

TAG	Proyecto	Avance	Venta	Margen al cierre	Margen %	Nota
UMAG	UMAG	100,0%	\$14.563.245	\$8.943.265	61,4%	93/100
MLER	Microturbina LER	100,0%	\$5.325.325	\$2.750.148	51,6%	82/100

INDICADORES COMPLETOS DEL PLAYBOOK (PONDERADOS POR VENTA)

RESULTADO A LA FECHA		
Margen neto %	58,8%	Objetivo playbook: 25%
Desviación % Total	-18,7%	Ideal: cercano a 0%
Ahorro/Sobrecosto Total	\$1.884.888	Ideal: positivo (ahorro)
Margen por día de ejecución	—	
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA		
Desviación % Materiales	17,8%	Ideal: cercano a 0%
Desviación % Equipos	-64,7%	Ideal: cercano a 0%
Desviación % MO	-27,6%	Ideal: cercano a 0%
Desviación % Otros	-16,8%	Ideal: cercano a 0%
Error del presupuesto %	26,8%	Ideal: cercano a 0%
Ahorro/Sobrecosto Materiales	\$-406.884	Ideal: positivo (ahorro)
Ahorro/Sobrecosto Equipos	\$941.783	Ideal: positivo (ahorro)
Ahorro/Sobrecosto MO	\$725.000	Ideal: positivo (ahorro)
Ahorro/Sobrecosto Otros	\$624.989	Ideal: positivo (ahorro)

PROYECCIÓN AL CIERRE		
Costo estimado al cierre	\$8.195.157	
Margen estimado al cierre	\$11.693.413	
Margen estimado al cierre %	58,8%	Objetivo playbook: 25%
Desviación estimada al cierre %	-18,7%	Sobrecosto sobre +10%
Margen al cierre % (escenario índice de costo)	—	Escenario pesimista
Nota del Proyecto	—	Bueno ≥ 70 · Excelente ≥ 85
Evaluación	—	Clasifica la Nota
ESTRUCTURA DEL COSTO REAL		
Costo Materiales % de venta	13,5%	
Costo Equipos % de venta	2,6%	
Costo MO % de venta	9,6%	
Costo Otros % de venta	15,6%	
Estructura % Materiales	32,8%	
Estructura % Equipos	6,3%	
Estructura % MO	23,2%	
Estructura % Otros	37,8%	



Análisis — Categoría I+D+i

La categoría más rentable de QUEMPIN: 58,8% de margen ponderado sobre \$19.888.570 de venta, 13 puntos sobre la mediana de la cartera y casi el doble del 29,8% de Mantenimiento. Sus dos proyectos —UMAG y Microturbina LER— promedian Nota 87,5, y ambos cerraron sobre el objetivo de 25%. Es la línea de negocio con mejor retorno por peso vendido de la empresa.

Fortalezas

- Margen acumulado de **\$11.693.413 (58,8% ponderado)** sobre el 13,9% de la venta de la cartera: **genera el 19,5% del margen total con menos de un séptimo de la facturación.**
- Los dos proyectos superan la mediana de margen de la cartera: **UMAG 61,4% (Nota 93) y MLER 51,6% (Nota 82).**
- Mano de Obra cerró **-27,6% bajo presupuesto** (\$2.625.000 → \$1.900.000) contra un sesgo de empresa de +1,0%: **el control de horas más eficiente por categoría.**
- Otros cerró **-16,8%**, con un ahorro de \$624.989 sobre lo presupuestado.

Debilidades / riesgos

- Equipos se ejecutó en **\$513.733 contra \$1.455.516 presupuestados (-64,7%)** mientras Materiales se pasó **+17,8%**: **el presupuesto de la categoría describe mal cómo se hace realmente el trabajo.**
- Solo **dos proyectos y dos clientes**, ninguno recurrente: la categoría más rentable es también la de base más frágil.
- UMAG arrastra una **alerta de subejecución (72,9% del presupuesto gastado)**: el 58,8% ponderado podría bajar si aparecen costos pendientes.
- Materiales a **+17,8%**, en línea con el sesgo general de la empresa (+16,6%): **la categoría no escapa al problema estructural de subestimar insumos.**

Análisis de KPIs

El patrón definitorio de I+D+i es el desplazamiento Equipos→Materiales: se presupuesta adquirir o arrendar equipamiento y en la práctica se construye a partir de insumos. Con dos proyectos independientes mostrando el mismo signo (MLER: Equipos -98,2%, Materiales +58,3%; y el agregado de la categoría en -64,7% y +17,8%), deja de ser casualidad y pasa a ser una característica del tipo de trabajo. La buena noticia es que el margen resiste: ambos proyectos cerraron muy sobre el objetivo pese a esa imprecisión, lo que indica que el precio de venta de I+D+i está bien calibrado aunque el presupuesto de costos no lo esté.

Qué hacer con esto

1. **Priorizar comercialmente esta categoría:** con 58,8% de margen ponderado contra 29,8% de Mantenimiento, cada peso vendido en I+D+i rinde el doble.
2. **Corregir la plantilla de cotización trasladando presupuesto de Equipos a Materiales:** dos proyectos consecutivos bastan para ajustar el reparto.
3. **Ampliar la base de clientes** — dos clientes no recurrentes sostienen toda la línea; perder uno reduce la categoría a la mitad.
4. **Cerrar el registro de costos de UMAG** antes de usar el 58,8% como referencia de precio en nuevas propuestas.
