



Proyecto Microturbina LER

Generado el 24-09-2026

Microturbina LER

CERRADO

TAG MLER

Cliente Microturbina LER

Categoría I+D+i

Avance 100,0%

Inicio 03-11-2025

Cierre 01-02-2026

82/100

Nota del Proyecto
Bueno

51,6%

Margen estimado al cierre
Objetivo 25% · mediana cartera
45,6%

8,8%

Desviación estimada al cierre
Presupuesto \$2.366.280


\$5.325.325

Monto de Venta (sin IVA)
3,7% de la venta de la cartera


ALERTAS DE DATOS Y DE PRESUPUESTO

- Otros tiene gasto real pero presupuesto 0: su desviación no se puede medir.

PRESUPUESTO VS. GASTO REAL POR CATEGORÍA

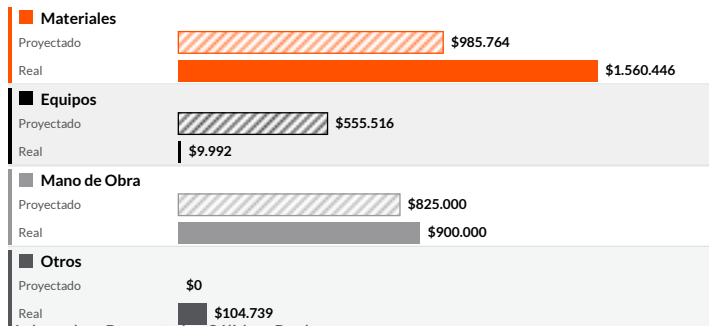

COMPOSICIÓN DEL COSTO REAL

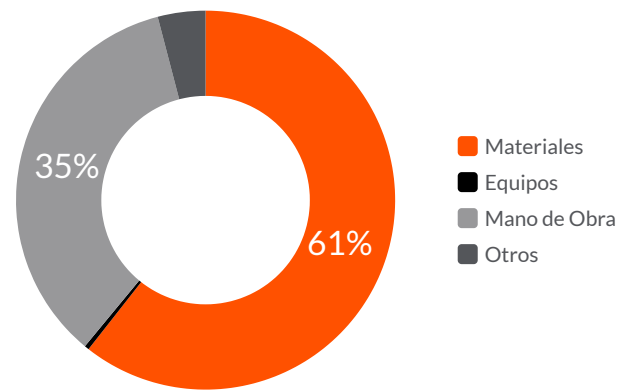

DATOS CLAVE

Concepto	Monto
Monto de Venta (sin IVA)	\$5.325.325
Costo presupuestado	\$2.366.280
Costo real a la fecha	\$2.575.177
Costo estimado al cierre	\$2.575.177
Margen estimado al cierre	\$2.750.148

INDICADORES COMPLETOS DEL PLAYBOOK

RESULTADO A LA FECHA		
Margen neto %	51,6%	Objetivo playbook: 25%
Desviación % Total	8,8%	Ideal: cercano a 0%
Ahorro/Sobrecosto Total	-\$208.897	Ideal: positivo (ahorro)
Margen por día de ejecución	\$30.557	
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA		
Desviación % Materiales	58,3%	Ideal: cercano a 0%
Desviación % Equipos	-98,2%	Ideal: cercano a 0%
Desviación % MO	9,1%	Ideal: cercano a 0%
Desviación % Otros	—	Ideal: cercano a 0%
Error del presupuesto %	54,9%	Ideal: cercano a 0%
Ahorro/Sobrecosto Materiales	-\$574.682	Ideal: positivo (ahorro)
Ahorro/Sobrecosto Equipos	\$545.524	Ideal: positivo (ahorro)
Ahorro/Sobrecosto MO	-\$75.000	Ideal: positivo (ahorro)
Ahorro/Sobrecosto Otros	-\$104.739	Ideal: positivo (ahorro)

PROYECCIÓN AL CIERRE		
Costo estimado al cierre	\$2.575.177	
Margen estimado al cierre	\$2.750.148	
Margen estimado al cierre %	51,6%	Objetivo playbook: 25%
Desviación estimada al cierre %	8,8%	Sobrecosto sobre +10%
Margen al cierre % (escenario índice de costo)	51,6%	Escenario pesimista
Nota del Proyecto	82/100	Bueno ≥70 · Excelente ≥85
Evaluación	Bueno	Clasifica la Nota
ESTRUCTURA DEL COSTO REAL		
Costo Materiales % de venta	29,3%	
Costo Equipos % de venta	0,2%	
Costo MO % de venta	16,9%	
Costo Otros % de venta	2,0%	
Estructura % Materiales	60,6%	
Estructura % Equipos	0,4%	
Estructura % MO	34,9%	
Estructura % Otros	4,1%	



Análisis — Proyecto Microturbina LER (MLER)

Proyecto de I+D+i cerrado con margen de 51,6% y Nota 82/100, por encima de la mediana de la cartera. El sobrecosto de +8,8% se mantiene dentro del umbral de alerta, pero la composición del gasto se desplazó por completo respecto de lo planeado: \$545.524 que se habían presupuestado para Equipos terminaron gastándose en Materiales.

Fortalezas

- Margen al cierre de **\$2.750.148 (51,6%)**, más del doble del objetivo de 25% del playbook y **6 puntos sobre la mediana de la cartera**.
- Mano de Obra se desvió solo **+9,1%** (\$825.000 → \$900.000), el control de horas más ajustado entre los proyectos con desvío al alza.
- El sobrecosto total quedó en **+8,8%**, **bajo el umbral de alerta de +10%: ninguna alerta de sobrecosto activa**.
- Ciclo de **90 días** (03-11-2025 al 01-02-2026) para un desarrollo de I+D, con resultado comercial positivo desde el primer proyecto.

Debilidades / riesgos

- **Equipos se ejecutó en \$9.992 contra \$555.516 presupuestados (-98,2%)**, mientras Materiales se pasó **+58,3%** (\$985.764 → \$1.560.446): el gasto migró de una partida a la otra casi peso por peso.
- Materiales a **+58,3%** contra un sesgo de cartera de +16,6%: **este proyecto se pasó 42 puntos más que el promedio de la empresa** en la categoría donde QUEMPIN ya tiende a subestimar.
- **"Otros" registra \$104.739 de gasto real sin presupuesto asignado**: su desviación no se puede medir, y es el cuarto proyecto de la cartera con el mismo problema.
- Error del presupuesto de **54,9%**: aunque el total se desvió solo +8,8%, más de la mitad del presupuesto quedó mal repartido entre categorías.

Análisis de KPIs

La Nota de 82/100 refleja bien el proyecto: margen alto y desviación total contenida. Pero el patrón Equipos→Materiales merece una lectura aparte, porque en I+D+i es esperable: se presupuesta comprar o arrendar un equipo y en la práctica se termina construyendo a partir de insumos. Los dos proyectos de la categoría confirman la tendencia — I+D+i muestra Equipos en -64,7% y Materiales en +17,8% a nivel agregado. Eso no es un error de este proyecto, es una característica del tipo de trabajo que el modelo de cotización todavía no incorpora.

Qué hacer con esto

1. **Ajustar el reparto Equipos/Materiales al cotizar I+D+i**: con dos proyectos cerrados mostrando el mismo desplazamiento, corresponde trasladar presupuesto de Equipos a Materiales en la plantilla de la categoría.
2. **Presupuestar "Otros" con un valor distinto de cero** aunque sea una estimación gruesa — sin línea base, ese gasto queda fuera de todo control de desviación.
3. **Usar el margen de 51,6% como piso al fijar precio en I+D+i**: la categoría promedia 58,8% ponderado y es la más rentable de la empresa, lo que justifica priorizarla comercialmente.
