



Reporte de Categoría – I+D+i

Generado el 20-08-2026

Categoría I+D+i – Panel de verificación

65,8%

Margen neto % (agregado)

\$19.888.570

Venta total (sin IVA)

2

Nº de proyectos


\$3.283.173

Ahorro/Sobrecosto Total


DATOS CLAVE

Concepto	Monto
Venta total (sin IVA)	\$19.888.570
Costos Totales Real	\$6.796.872
Margen Real	\$13.091.698
Desviación % Total	-32,6%

COMPOSICIÓN DE COSTOS REALES

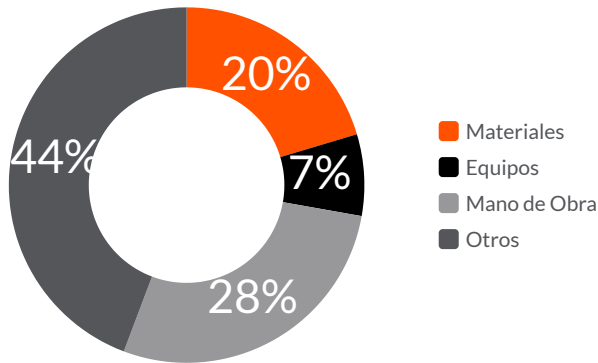

COSTOS PROYECTADOS VS. REALES POR CATEGORÍA DE GASTO

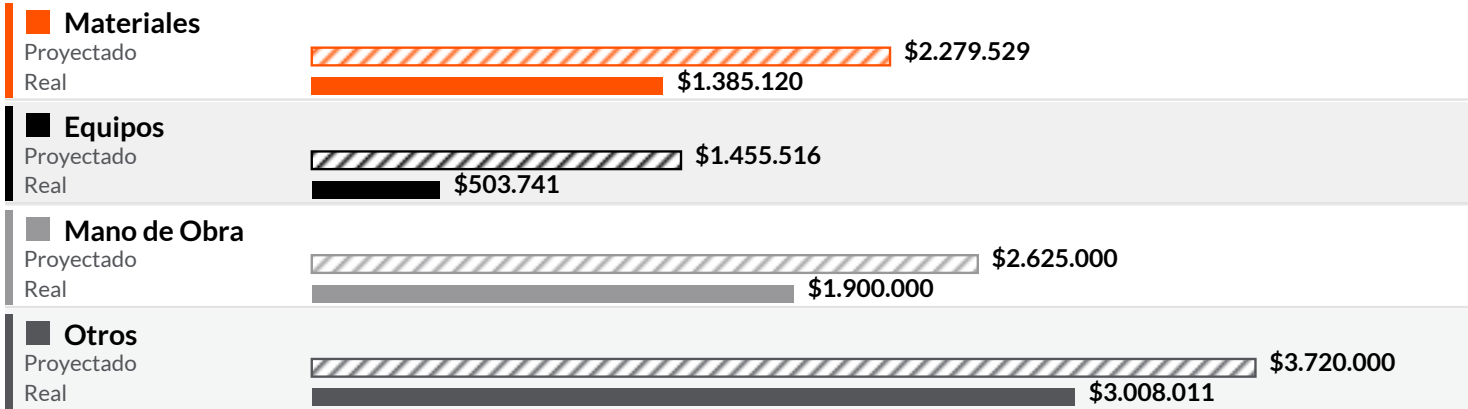

INDICADORES COMPLETOS (AGREGADO DE 2 PROYECTOS: UMAG, MLER) – NARANJO/NEGRITA = KPI FUERA DE RANGO

KPI	Valor	Referencia
Margen neto %	65,8%	Objetivo playbook: 25%
Costo Materiales % de venta	7,0%	
Costo Equipos % de venta	2,5%	
Costo MO % de venta	9,6%	
Costo Otros % de venta	15,1%	
Estructura % Materiales	20,4%	
Estructura % Equipos	7,4%	
Estructura % MO	28,0%	
Estructura % Otros	44,3%	
Desviación % Materiales	-39,2%	Ideal: cercano a 0%
Desviación % Equipos	-65,4%	Ideal: cercano a 0%
Desviación % MO	-27,6%	Ideal: cercano a 0%
Desviación % Otros	-19,1%	Ideal: cercano a 0%
Desviación % Total	-32,6%	Ideal: cercano a 0%
Ahorro/Sobrecosto Materiales	\$894.409	Ideal: positivo (ahorro)
Ahorro/Sobrecosto Equipos	\$951.775	Ideal: positivo (ahorro)
Ahorro/Sobrecosto MO	\$725.000	Ideal: positivo (ahorro)
Ahorro/Sobrecosto Otros	\$711.989	Ideal: positivo (ahorro)
Ahorro/Sobrecosto Total	\$3.283.173	Ideal: positivo (ahorro)



Análisis — Categoría I+D+i

La categoría I+D+i agrupa hoy **2 proyectos con datos completos** (UMAG y MLER, ambos cerrados), con una venta conjunta de **\$19.888.570** y un margen neto agregado de **65,8%**, muy por sobre el objetivo del playbook (25%). Los costos reales quedaron **32,6% por debajo** de lo proyectado en el agregado, con desviación negativa en las 4 categorías de gasto en ambos proyectos — un patrón consistente, no un caso aislado.

Fortalezas

- Margen neto agregado de **65,8%** (\$13.091.698 sobre \$19.888.570 de venta), muy por sobre el objetivo del playbook (25%) en los dos proyectos que componen la categoría.
- Ahorro/Sobrecosto Total agregado de **\$3.283.173**: los costos reales quedaron por debajo de lo proyectado en las 4 categorías de gasto, en UMAG y en MLER.
- Nota del Proyecto individual: UMAG 93/100 (Excelente) y MLER 96/100 (Excelente) — con solo 2 proyectos, ambos en el tramo más alto de la escala.

Debilidades / riesgos

- Solo **2 proyectos** componen la categoría — un promedio con $n=2$ es sensible a que cualquiera de los dos sea un caso atípico; todavía no es una muestra que permita hablar de "comportamiento típico" de I+D+i.
- La desviación agregada de **-32,6%** (costos reales muy por debajo de lo proyectado en ambos proyectos, entre -19% y -65% por categoría de gasto) sugiere sobreestimación sistemática al cotizar I+D+i, no solo buena ejecución — si se repite en el próximo proyecto de la categoría, revisar el método de cotización.
- "Mano de Obra Real" es 100% manual en los dos proyectos de la categoría (UMAG y MLER) — sin verificación cruzada automática contra Centro de Costos, a diferencia de Materiales/Equipos/Otros.

Análisis de KPIs

Leer estos KPIs como una tendencia inicial, no un promedio consolidado. Con $n=2$, el margen neto agregado (65,8%) queda entre el de MLER (77,9%) y el de UMAG (61,4%) — ambos altos, lo que refuerza la lectura de sobrecotización más que de un promedio casual. La estructura de costos agregada muestra a "Otros" como el mayor componente (44,3% de los costos reales), impulsado sobre todo por UMAG (Otros Costos Reales muy superior a MLER, que casi no tuvo gasto en esa categoría) — no asumir que "Otros" pesa igual en todo proyecto I+D+i futuro sin revisar el desglose de "Detalle Costos Reales".

Notas estratégicas

1. No fijar todavía un margen objetivo específico para I+D+i (ej. "margen esperado I+D+i = 65,8%") basado en solo 2 cierres — esperar un tercero antes de usarlo como benchmark de venta.
2. Revisar el método de cotización de proyectos I+D+i: la desviación agregada negativa en las 4 categorías de gasto, en los 2 proyectos, sugiere que se está dejando margen sobre la mesa en la etapa de venta.
3. Re-generar este reporte apenas cierre un tercer proyecto I+D+i — con $n=3$ ya es posible hablar de un rango en vez de un promedio de 2 puntos.
