



Reporte de Cliente – Universidad de Magallanes

Generado el 20-08-2026

Cliente Universidad de Magallanes – Panel de verificación

\$8.943.265

CLTV

61,4%

Margen de utilidad %

Cientes estratégicos

Clasificación


1 proyecto(s)

Vida del cliente


DATOS CLAVE (CLTV)

Concepto	Monto
AOV (Valor promedio de venta)	\$14.563.245
Frecuencia de compra (proyectos/año)	1,0
Margen de utilidad %	61,4%
CLTV	\$8.943.265

COMPOSICIÓN DE COSTOS REALES

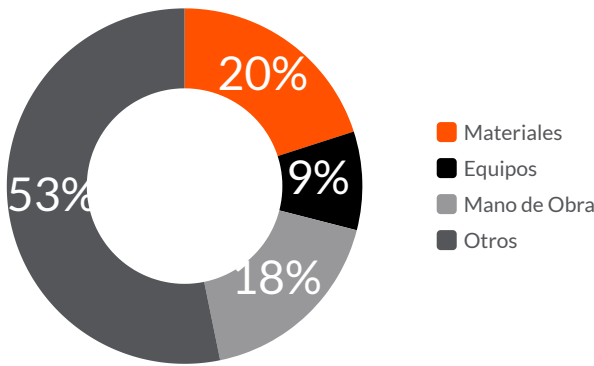

COSTOS PROYECTADOS VS. REALES POR CATEGORÍA DE GASTO

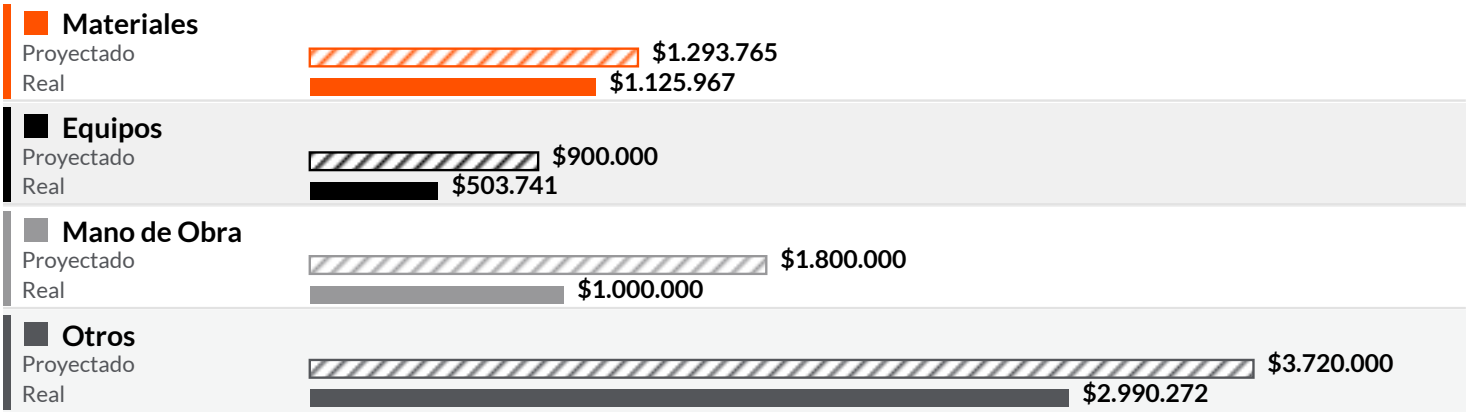

INDICADORES COMPLETOS (AGREGADO DE 1 PROYECTO(S) DEL CLIENTE: UMAG) – NARANJO/NEGRITA = KPI FUERA DE RANGO

KPI	Valor	Referencia
Margen neto %	61,4%	Objetivo playbook: 25%
Costo Materiales % de venta	7,7%	
Costo Equipos % de venta	3,5%	
Costo MO % de venta	6,9%	
Costo Otros % de venta	20,5%	
Estructura % Materiales	20,0%	
Estructura % Equipos	9,0%	
Estructura % MO	17,8%	
Estructura % Otros	53,2%	
Desviación % Materiales	-13,0%	Ideal: cercano a 0%
Desviación % Equipos	-44,0%	Ideal: cercano a 0%
Desviación % MO	-44,4%	Ideal: cercano a 0%
Desviación % Otros	-19,6%	Ideal: cercano a 0%
Desviación % Total	-27,1%	Ideal: cercano a 0%
Ahorro/Sobrecosto Materiales	\$167.798	Ideal: positivo (ahorro)
Ahorro/Sobrecosto Equipos	\$396.259	Ideal: positivo (ahorro)
Ahorro/Sobrecosto MO	\$800.000	Ideal: positivo (ahorro)
Ahorro/Sobrecosto Otros	\$729.728	Ideal: positivo (ahorro)
Ahorro/Sobrecosto Total	\$2.093.785	Ideal: positivo (ahorro)



Análisis — Cliente Universidad de Magallanes

Universidad de Magallanes es, hasta ahora, el cliente de **mayor ticket** de la cartera con datos completos: AOV de **\$14.563.245** en su único proyecto cerrado (UMAG), con CLTV de **\$8.943.265** y clasificación "Clientes estratégicos" — el nivel más alto de la escala. El margen de utilidad fue de **61,4%**, muy por sobre el objetivo del playbook (25%), con costos reales por debajo de lo proyectado en las 4 categorías de gasto.

Fortalezas

- Mayor AOV de la cartera con datos completos: **\$14.563.245** — más del doble del segundo ticket más alto (Cremación Concepción, \$6.518.650).
- CLTV de **\$8.943.265**, clasificado como "Clientes estratégicos", con margen de utilidad de **61,4%**.
- Nota del Proyecto 93/100 ("Excelente") — ahorro consistente en las 4 categorías de gasto, Ahorro/Sobrecosto Total de \$2.093.785.

Debilidades / riesgos

- Un solo proyecto registrado: pese a ser el cliente de mayor ticket, CLTV y clasificación siguen dependiendo de un único cierre.
- Sobrecosto presupuestario aparte, hay desviaciones marcadas en Equipos (-44,0%) y Mano de Obra (-44,4%) — ambas por debajo de lo proyectado en más de 40%, lo que junto al patrón ya visto en I+D+i sugiere una cotización sistemáticamente conservadora para este segmento, no solo buena ejecución.
- "Otros" concentra **53,2%** de los costos reales del proyecto — el componente individual más grande, y el que más pesa en pesos (\$2.990.272) pese a también quedar 19,6% bajo lo proyectado.

Análisis de KPIs

Con \$14.563.245 de venta, este proyecto es 2,2 veces más grande que el segundo ticket más alto evaluado en esta ronda — cualquier lectura de "cliente promedio" de la cartera queda distorsionada si se pondera por CLTV en pesos sin tener esto en cuenta. Las 4 categorías de gasto quedaron por debajo de lo proyectado (entre 13,0% y 44,4%), un patrón consistente con el resto de la categoría I+D+i — reforzando la hipótesis de que el método de cotización de esta categoría sobreestima costos de forma sistemática, no que la ejecución de este proyecto en particular haya sido excepcional.

Notas estratégicas

1. Tratar a Universidad de Magallanes como cliente ancla de la cartera dado su ticket y margen, priorizando la relación comercial de cara a un segundo proyecto.
2. Aplicar la revisión del método de cotización de I+D+i (ya recomendada en el reporte de esa categoría) especialmente a proyectos de este porte — la brecha en pesos entre proyectado y real es la mayor de toda la cartera evaluada en esta ronda.
3. Revisar esta ficha cuando Universidad de Magallanes cierre un segundo proyecto — recién ahí el CLTV deja de depender de un solo dato.
