



Cliente Putaendo Hospital Pinel

Generado el 24-09-2026

Putaendo Hospital Pinel

Proyectos completos **1**

Cliente recurrente **No**

Clasificación **Clientes estratégicos**

\$16.801.799

Venta acumulada (sin IVA)
11,8% de la venta de la cartera

\$9.038.598

Margen acumulado (al cierre)


53,8%

Margen %
Objetivo 25%


**Clientes
estratégicos**

Clasificación
1 proyecto(s) completos

PRESUPUESTO VS. GASTO REAL POR CATEGORÍA

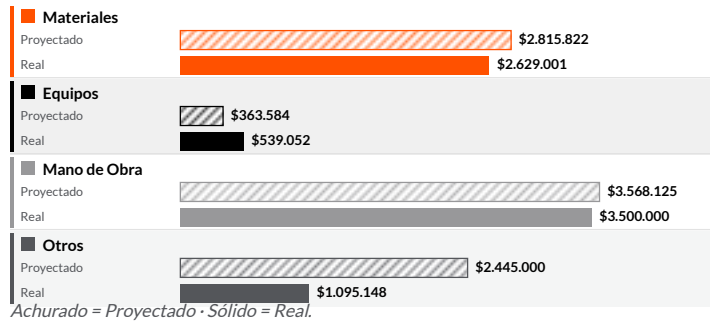

COMPOSICIÓN DEL COSTO REAL

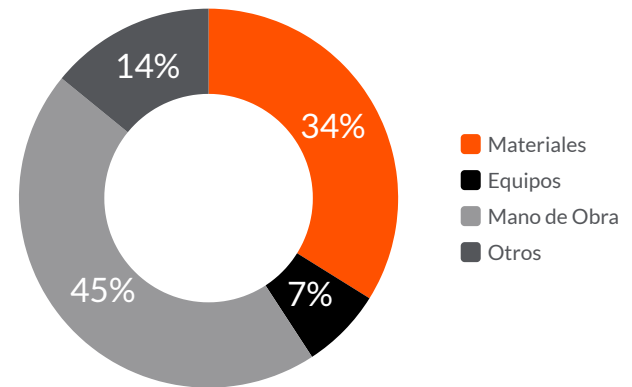

PROYECTOS CONSIDERADOS (SOLO LOS DE DATOS COMPLETOS)

TAG	Proyecto	Avance	Venta	Margen al cierre	Margen %	Nota
HPIN	Putaendo Hospital Pinel	100,0%	\$16.801.799	\$9.038.598	53,8%	91/100

INDICADORES COMPLETOS DEL PLAYBOOK (PONDERADOS POR VENTA)

RESULTADO A LA FECHA		
Margen neto %	53,8%	Objetivo playbook: 25%
Desviación % Total	-15,5%	Ideal: cercano a 0%
Ahorro/Sobrecosto Total	\$1.429.330	Ideal: positivo (ahorro)
Margen por día de ejecución	—	
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA		
Desviación % Materiales	-6,6%	Ideal: cercano a 0%
Desviación % Equipos	48,3%	Ideal: cercano a 0%
Desviación % MO	-1,9%	Ideal: cercano a 0%
Desviación % Otros	-55,2%	Ideal: cercano a 0%
Error del presupuesto %	19,4%	Ideal: cercano a 0%
Ahorro/Sobrecosto Materiales	\$186.821	Ideal: positivo (ahorro)
Ahorro/Sobrecosto Equipos	\$-175.468	Ideal: positivo (ahorro)
Ahorro/Sobrecosto MO	\$68.125	Ideal: positivo (ahorro)
Ahorro/Sobrecosto Otros	\$1.349.852	Ideal: positivo (ahorro)

PROYECCIÓN AL CIERRE		
Costo estimado al cierre	\$7.763.201	
Margen estimado al cierre	\$9.038.598	
Margen estimado al cierre %	53,8%	Objetivo playbook: 25%
Desviación estimada al cierre %	-15,5%	Sobrecosto sobre +10%
Margen al cierre % (escenario índice de costo)	—	Escenario pesimista
Nota del Proyecto	—	Bueno ≥70 · Excelente ≥85
Evaluación	—	Clasifica la Nota
ESTRUCTURA DEL COSTO REAL		
Costo Materiales % de venta	15,6%	
Costo Equipos % de venta	3,2%	
Costo MO % de venta	20,8%	
Costo Otros % de venta	6,5%	
Estructura % Materiales	33,9%	
Estructura % Equipos	6,9%	
Estructura % MO	45,1%	
Estructura % Otros	14,1%	



Análisis — Cliente Putaendo Hospital Pinel

Putaendo Hospital Pinel es el cliente que más margen le ha dejado a QUEMPIN entre los 8 con datos completos: \$9.038.598 (53,8%), con un solo proyecto (HPIN, Nota 91/100). Es el tercer cliente por venta (11,8% de la cartera) y está entre los estratégicos, pero todavía no es recurrente: todo su valor descansa en un único trabajo.

Fortalezas

- **Mayor margen acumulado de la cartera:** \$9.038.598, apenas sobre Universidad de Magallanes (\$8.943.265) y Junji's Valparaíso (\$7.676.704).
- **Rentable y bien cotizado a la vez:** 53,8% de margen, sobre la mediana de 45,6%, con el costo final 15,5% bajo el presupuesto.
- **Clasificación "Clientes estratégicos":** el tercio superior de la cartera por margen acumulado.

Debilidades / riesgos

- **Un solo proyecto, no recurrente:** el margen acumulado y la clasificación dependen de HPIN; no hay historial que muestre si ese resultado se repite.
- **Parte de la concentración de la cartera:** con los dos mayores clientes suma el 58,7% de la venta, y la cartera equivale a 6,7 clientes iguales de los 13 que hay.
- **Su proyecto figura en desarrollo** (avance 100% con cierre al 03-03-2027): el margen acumulado todavía no es definitivo.

Análisis de KPIs

Con un solo proyecto, los KPIs del cliente son los de HPIN: margen 53,8%, 8 puntos sobre la mediana, y un presupuesto que se equivocó solo 19,4% (el segundo mejor de la cartera). Lo que agrega la mirada de cliente es la pregunta comercial: la clasificación de estratégico mide cuánto margen dejó, no cuántas veces compró. Un cliente estratégico que no repite es una oportunidad todavía no capturada, no un activo consolidado.

Qué hacer con esto

1. **Buscar un segundo proyecto con el hospital:** es el cliente con mejor resultado y aún no repite.
2. **Cotizarlo sobre los costos reales de HPIN,** corrigiendo la partida de Equipos, que se pasó +48,3%.
3. **Confirmar el estado del proyecto** (avance o fecha de cierre) antes de dar por cerrado su margen.
