



Categoría Mantenimiento

Generado el 24-09-2026

Mantenimiento

Proyectos completos 4 Clientes Cesfam Constitución, Cremación Concepción, ESFOCAR, Junji's Valparaíso

\$48.558.633

Venta de la categoría
34,0% de la venta de la cartera

\$14.482.047

Margen acumulado (al cierre)


29,8%

Margen % ponderado
Objetivo 25%


74/100

Nota promedio
4 proyecto(s) · 4 cliente(s)

PRESUPUESTO VS. GASTO REAL POR CATEGORÍA

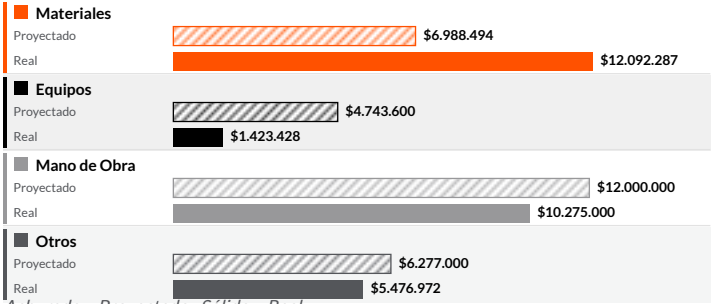

COMPOSICIÓN DEL COSTO REAL

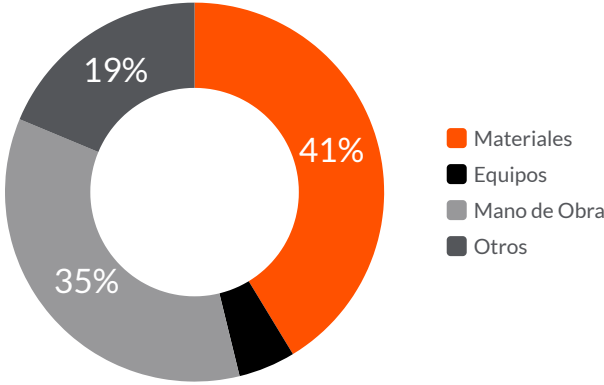

PROYECTOS CONSIDERADOS (SOLO LOS DE DATOS COMPLETOS)

TAG	Proyecto	Avance	Venta	Margen al cierre	Margen %	Nota
JUNJ	Junji's Valparaíso	75,0%	\$31.508.600	\$7.676.704	24,4%	54/100
CREM	Cremación Concepción	100,0%	\$6.518.650	\$1.255.488	19,3%	63/100
CCON	Cesfam Constitución	100,0%	\$5.581.223	\$1.562.168	28,0%	81/100
ESFO	ESFOCAR	100,0%	\$4.950.160	\$3.987.687	80,6%	96/100

INDICADORES COMPLETOS DEL PLAYBOOK (PONDERADOS POR VENTA)

RESULTADO A LA FECHA		
Margen neto %	39,7%	Objetivo playbook: 25%
Desviación % Total	-2,5%	Ideal: cercano a 0%
Ahorro/Sobrecosto Total	\$741.408	Ideal: positivo (ahorro)
Margen por día de ejecución	—	
PRESUPUESTO POR CATEGORÍA		
Desviación % Materiales	73,0%	Ideal: cercano a 0%
Desviación % Equipos	-70,0%	Ideal: cercano a 0%
Desviación % MO	-14,4%	Ideal: cercano a 0%
Desviación % Otros	-12,7%	Ideal: cercano a 0%
Error del presupuesto %	36,5%	Ideal: cercano a 0%
Ahorro/Sobrecosto Materiales	\$-5.103.793	Ideal: positivo (ahorro)
Ahorro/Sobrecosto Equipos	\$3.320.172	Ideal: positivo (ahorro)
Ahorro/Sobrecosto MO	\$1.725.000	Ideal: positivo (ahorro)
Ahorro/Sobrecosto Otros	\$800.028	Ideal: positivo (ahorro)

PROYECCIÓN AL CIERRE		
Costo estimado al cierre	\$34.076.586	
Margen estimado al cierre	\$14.482.047	
Margen estimado al cierre %	29,8%	Objetivo playbook: 25%
Desviación estimada al cierre %	13,6%	Sobrecosto sobre +10%
Margen al cierre % (escenario índice de costo)	—	Escenario pesimista
Nota del Proyecto	—	Bueno ≥70 · Excelente ≥85
Evaluación	—	Clasifica la Nota
ESTRUCTURA DEL COSTO REAL		
Costo Materiales % de venta	24,9%	
Costo Equipos % de venta	2,9%	
Costo MO % de venta	21,2%	
Costo Otros % de venta	11,3%	
Estructura % Materiales	41,3%	
Estructura % Equipos	4,9%	
Estructura % MO	35,1%	
Estructura % Otros	18,7%	



Análisis — Categoría Mantenimiento

La categoría más grande de QUEMPIN y la menos rentable: \$48.558.633 de venta —el 34,0% de la cartera— con apenas 29,8% de margen ponderado, 15,8 puntos bajo la mediana de la empresa. Concentra los cuatro proyectos de peor desempeño relativo y el principal problema estructural de costos: Materiales se pasó un 73,0% sobre presupuesto, \$5.103.793 por sobre lo cotizado.

Fortalezas

- **Es la principal fuente de ingresos de la empresa:** \$48.558.633, más del triple que la siguiente categoría, con \$14.482.047 de margen acumulado.
- **Mano de Obra cerró -14,4% bajo presupuesto** (\$12.000.000 → \$10.275.000) contra un sesgo de empresa de +1,0%: **la gestión de horas es lo que funciona en esta línea.**
- Otros cerró -12,7%, con \$800.028 de ahorro sobre lo presupuestado.
- Concentra **cuatro clientes distintos**, la base más amplia de la cartera: **es la categoría menos expuesta a la pérdida de un solo cliente.**

Debilidades / riesgos

- **Materiales en +73,0%: \$12.092.287 contra \$6.988.494 presupuestados.** Es 56 puntos peor que el sesgo general de la empresa (+16,6%) y explica por sí solo la brecha de rentabilidad de la categoría.
- **Equipos en -70,0%** (\$4.743.600 → \$1.423.428): el reverso del desborde de Materiales, señal de migración de costos entre partidas más que de ahorro genuino.
- Margen ponderado de **29,8%**, apenas sobre el objetivo de 25% — y solo porque ESFOCAR (80,6%, con costos pendientes de validar) empuja el promedio hacia arriba.
- **Los tres proyectos cerrados con datos confiables rinden 19,3%, 24,4% y 28,0%: sin ESFOCAR, la categoría no alcanza el objetivo de margen.**
- Contiene **JUNJ, el proyecto de peor Nota de la empresa (54/100)** y el 22,1% de la venta total, aún abierto y con el presupuesto agotado al 98,9%.

Análisis de KPIs

El margen ponderado de 29,8% esconde una dispersión grande: de 19,3% (CREM) a 80,6% (ESFO), y las Notas van de 54 a 96. Pero el dato que ordena la categoría es Materiales en +73,0%, porque aparece en los cuatro proyectos y en el más grande llega a +307,0%. Mantenimiento representa un tercio de la facturación con la mitad del margen porcentual de I+D+i, y la diferencia no está en el precio de venta sino en que la cotización de insumos no refleja lo que el trabajo consume. Es la corrección de mayor impacto económico disponible: 73% de error sobre \$6,99 millones presupuestados equivale a más de \$5,1 millones de margen perdido.

Qué hacer con esto

1. **Rehacer el estándar de materiales de Mantenimiento con los costos reales de los cuatro proyectos:** es la acción individual con mayor retorno sobre el margen consolidado de la empresa.
2. **Revisar si parte del desborde de Materiales corresponde a Equipos mal clasificados** — el patrón +73,0% / -70,0% es demasiado simétrico para ser coincidencia, y si es un problema de codificación la solución es distinta.
3. **Fijar un piso de 30% de margen proyectado** para nuevas cotizaciones de la categoría: al ritmo actual, el trabajo de mayor volumen es el de menor retorno.
4. **No leer el 29,8% como estable** mientras ESFOCAR tenga costos sin registrar y JUNJ siga abierto: ambos pueden bajar el ponderado de la categoría.
